


Kaufhaus Bozen  
Rahmenterminplan / Cronoprogramma



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorplanung und Genehmigungen			<				
Progettazione preliminare e processi autorizzativi							
Ausführungsplanung /Progettazione esecutiva			Ausführungsplanung /Progettazione esecutiva				
Bindung Ankermieter / vincolo noleggjo ancoraggi							
Busbahnhof Planung+Ausschreibung							
Progettazione Stazione autocorriere + gara							
Baukonzession Busbahnhof			X				
Concessione edilizia stazione autocorriere							
Busbahnhof Ausführung							
Esecuzione lavori stazione autocorriere					→		
Baukonzession weiteres Infrastrukturprojekt					X		
Concessione edilizia altre infrastrutture							
Umsetzung weiteres Infrastrukturprojekt					Umsetzung weiteres Infrastrukturprojekt	Realizzazione progetto infrastrutture	
Realizzazione progetto infrastrutture							
Ausweichlösung Handelskammer							
Soluzione transitoria Camera di Commercio							
Baukonzession Abbruch+Baugrube					X		
Concessione edilizia demolizione e scavo							
Abbruch und Baugrube / Demolizione e scavo							
Baukonzession Hochbau / Concessione edilizia edificazioni					X		
Hochbau / edificazione							
Mieterausbau / Locazioni							Mieterausbau / Locazioni
Gesamtinbetriebnahme/Eröffnung							→
Avvio attività generale/Inaugurazione							Eröffnung 03/2019 Apertura 03/2019



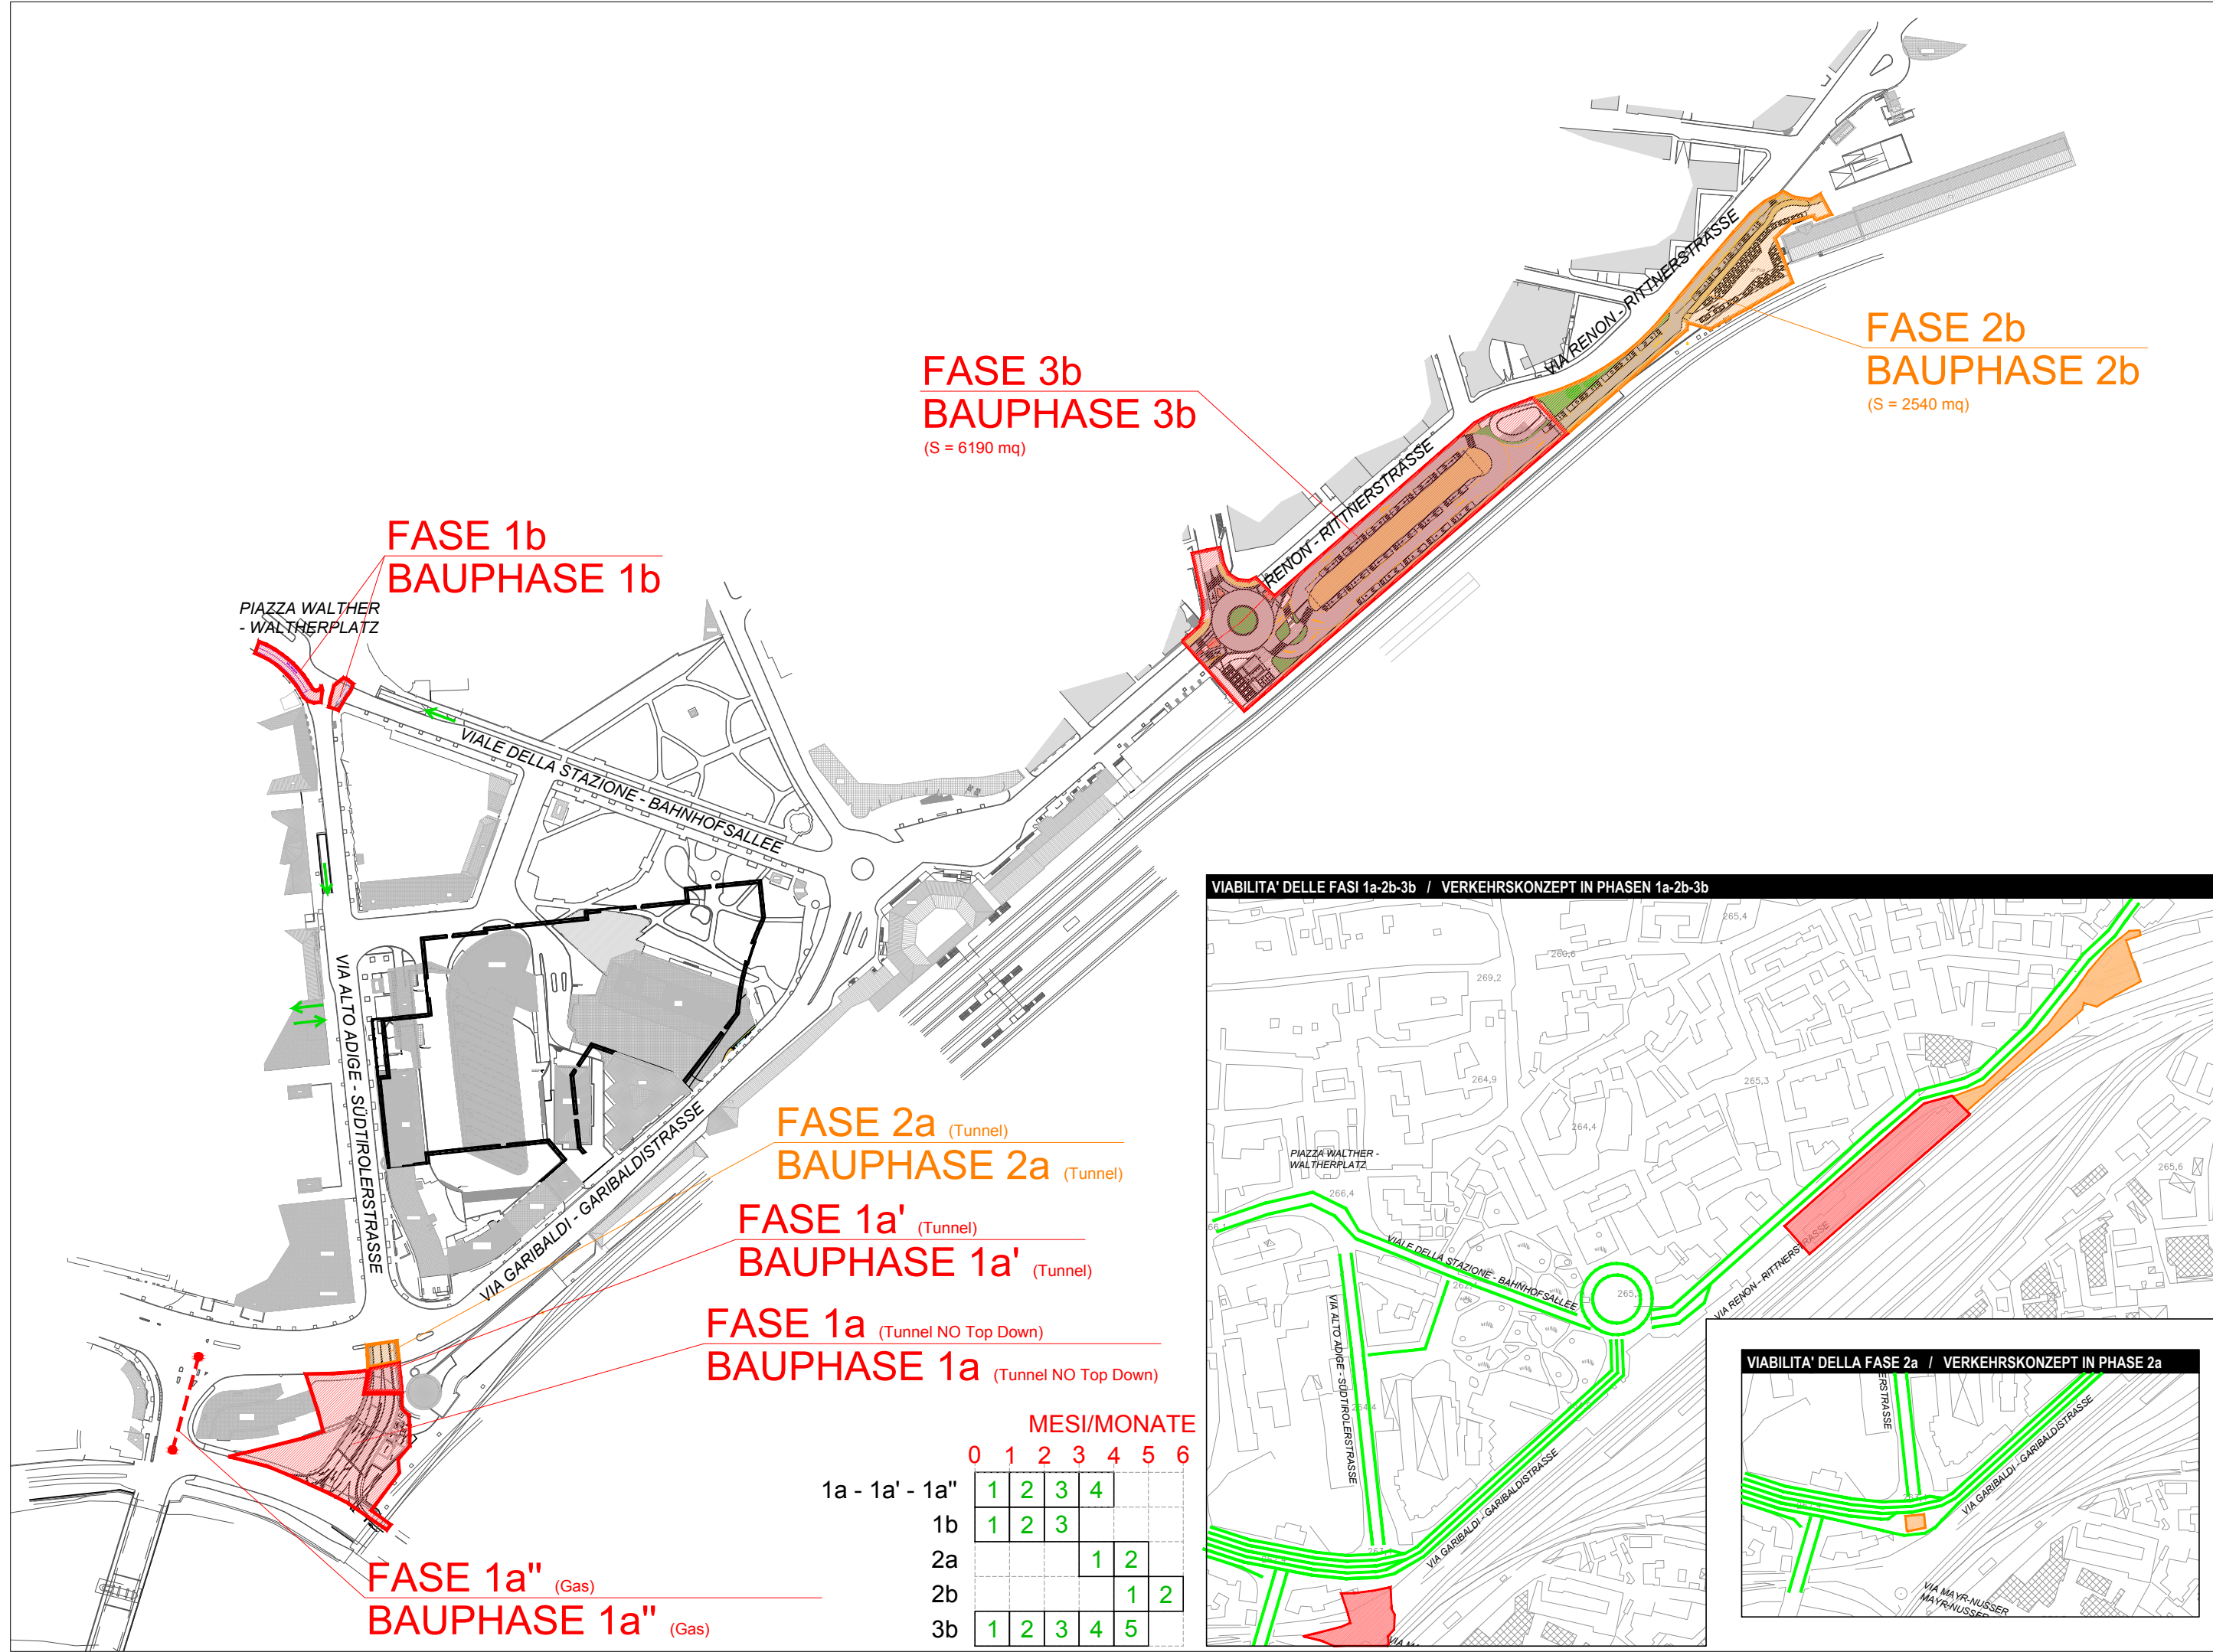

**FASE 1b**  
**BAUPHASE 1b**

**FASE 3b**  
**BAUPHASE 3b**  
(S = 6190 mq)

**FASE 2b**  
**BAUPHASE 2b**  
(S = 2540 mq)



**FASE 2a** (Tunnel)  
**BAUPHASE 2a** (Tunnel)


**FASE 1a'** (Tunnel)  
**BAUPHASE 1a'** (Tunnel)

**FASE 1a** (Tunnel NO Top Down)  
**BAUPHASE 1a** (Tunnel NO Top Down)



**FASE 1a''** (Gas)  
**BAUPHASE 1a''** (Gas)

	MESI/MONATE						
	0	1	2	3	4	5	6
1a - 1a' - 1a''	1	2	3	4			
1b	1	2	3				
2a				1	2		
2b					1	2	
3b	1	2	3	4	5		

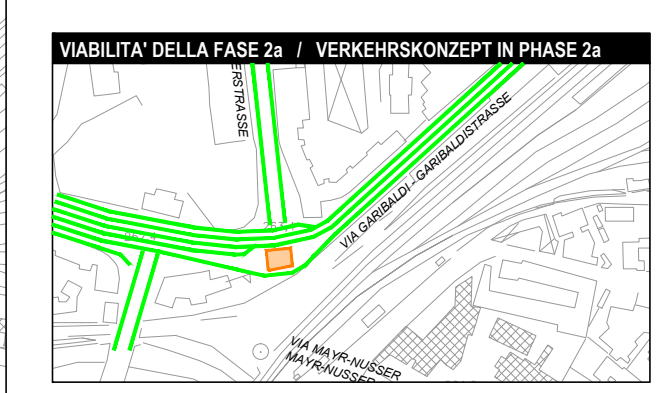
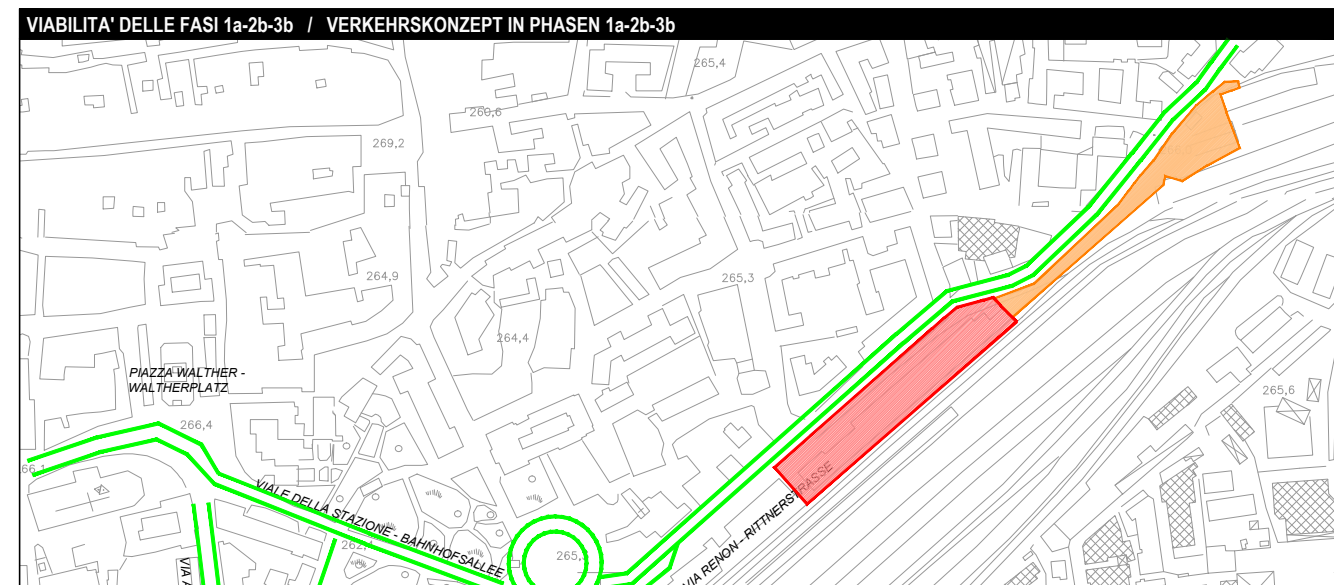


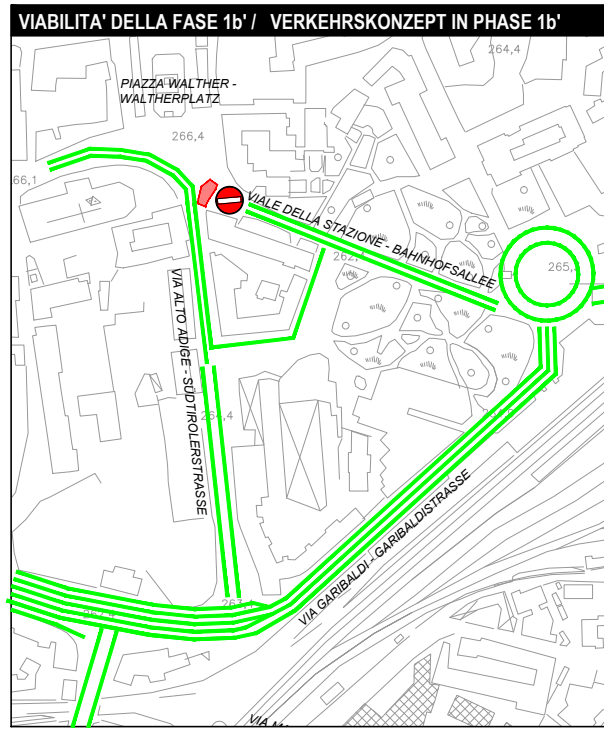


**FASE 1b'** (Tunnel)  
**BAUPHASE 1b'** (Tunnel)

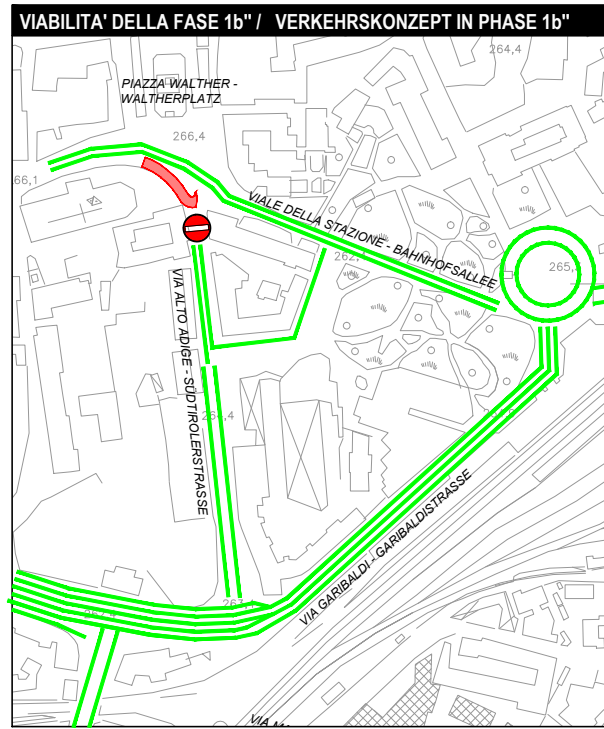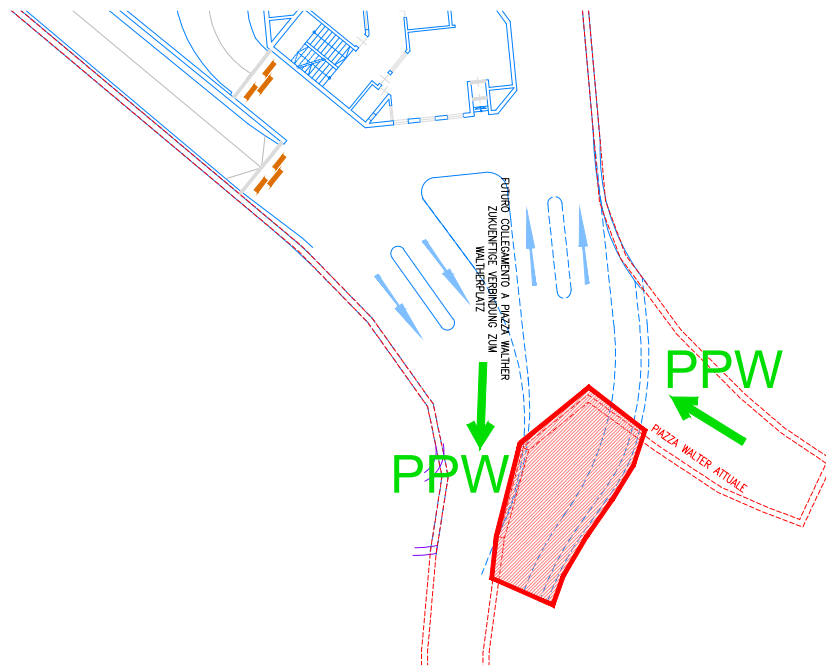


**FASE 1b''** (Tunnel)  
**BAUPHASE 1b''** (Tunnel)

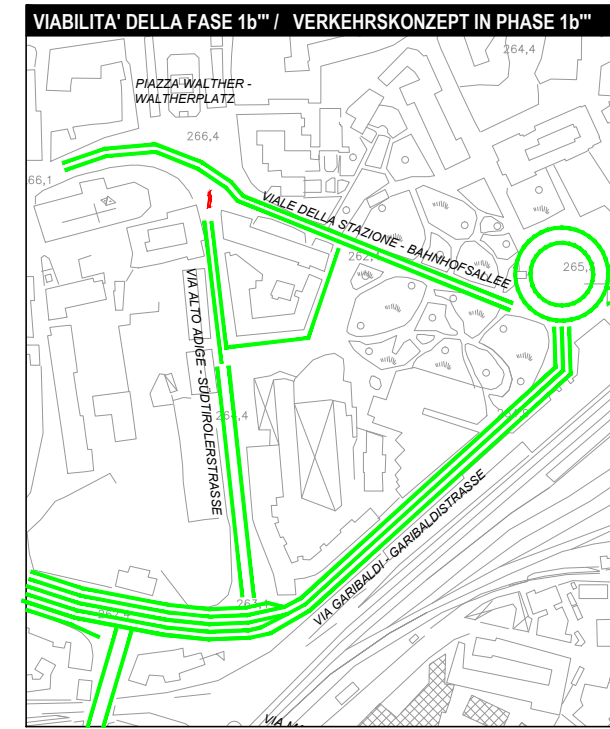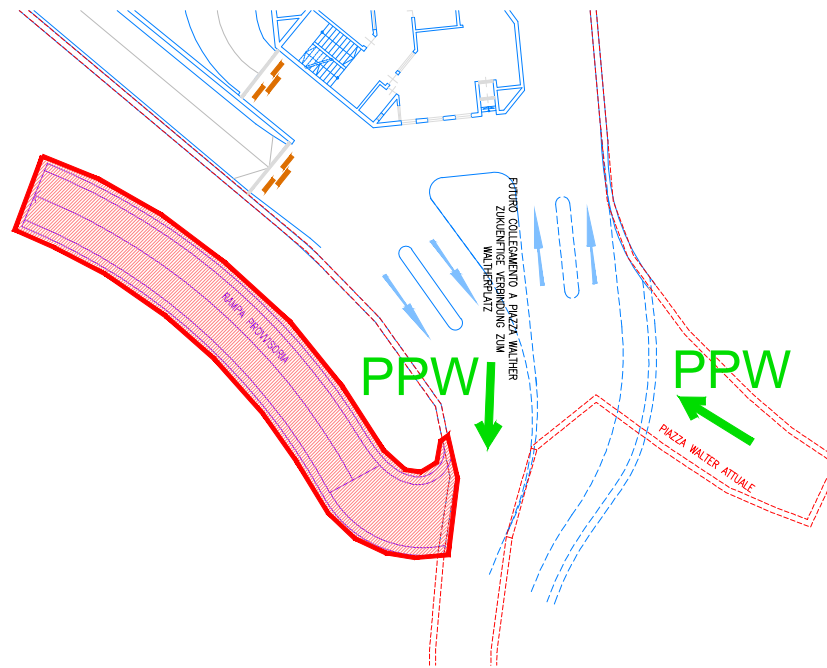

**FASE 1b'''** (Tunnel)  
**BAUPHASE 1b'''** (Tunnel)

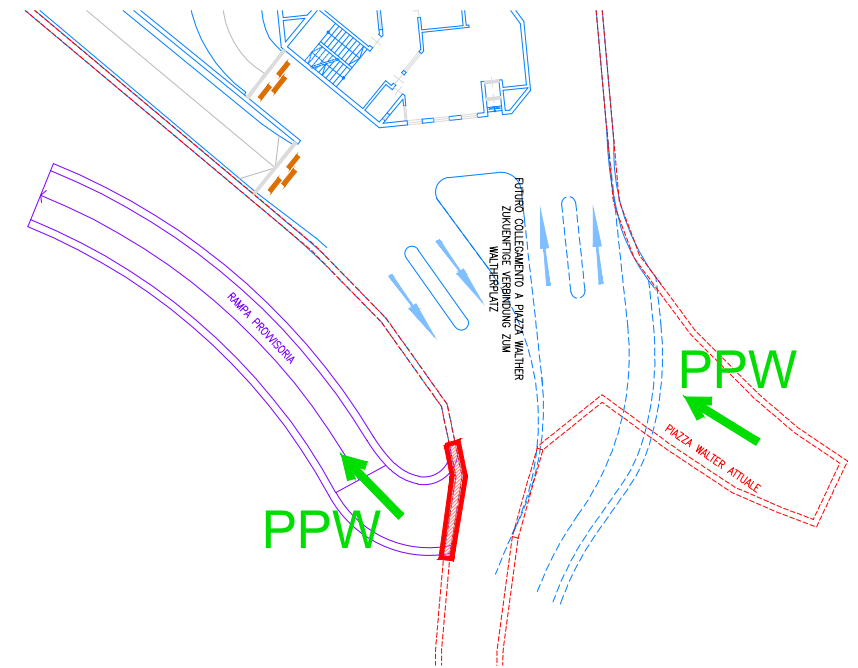

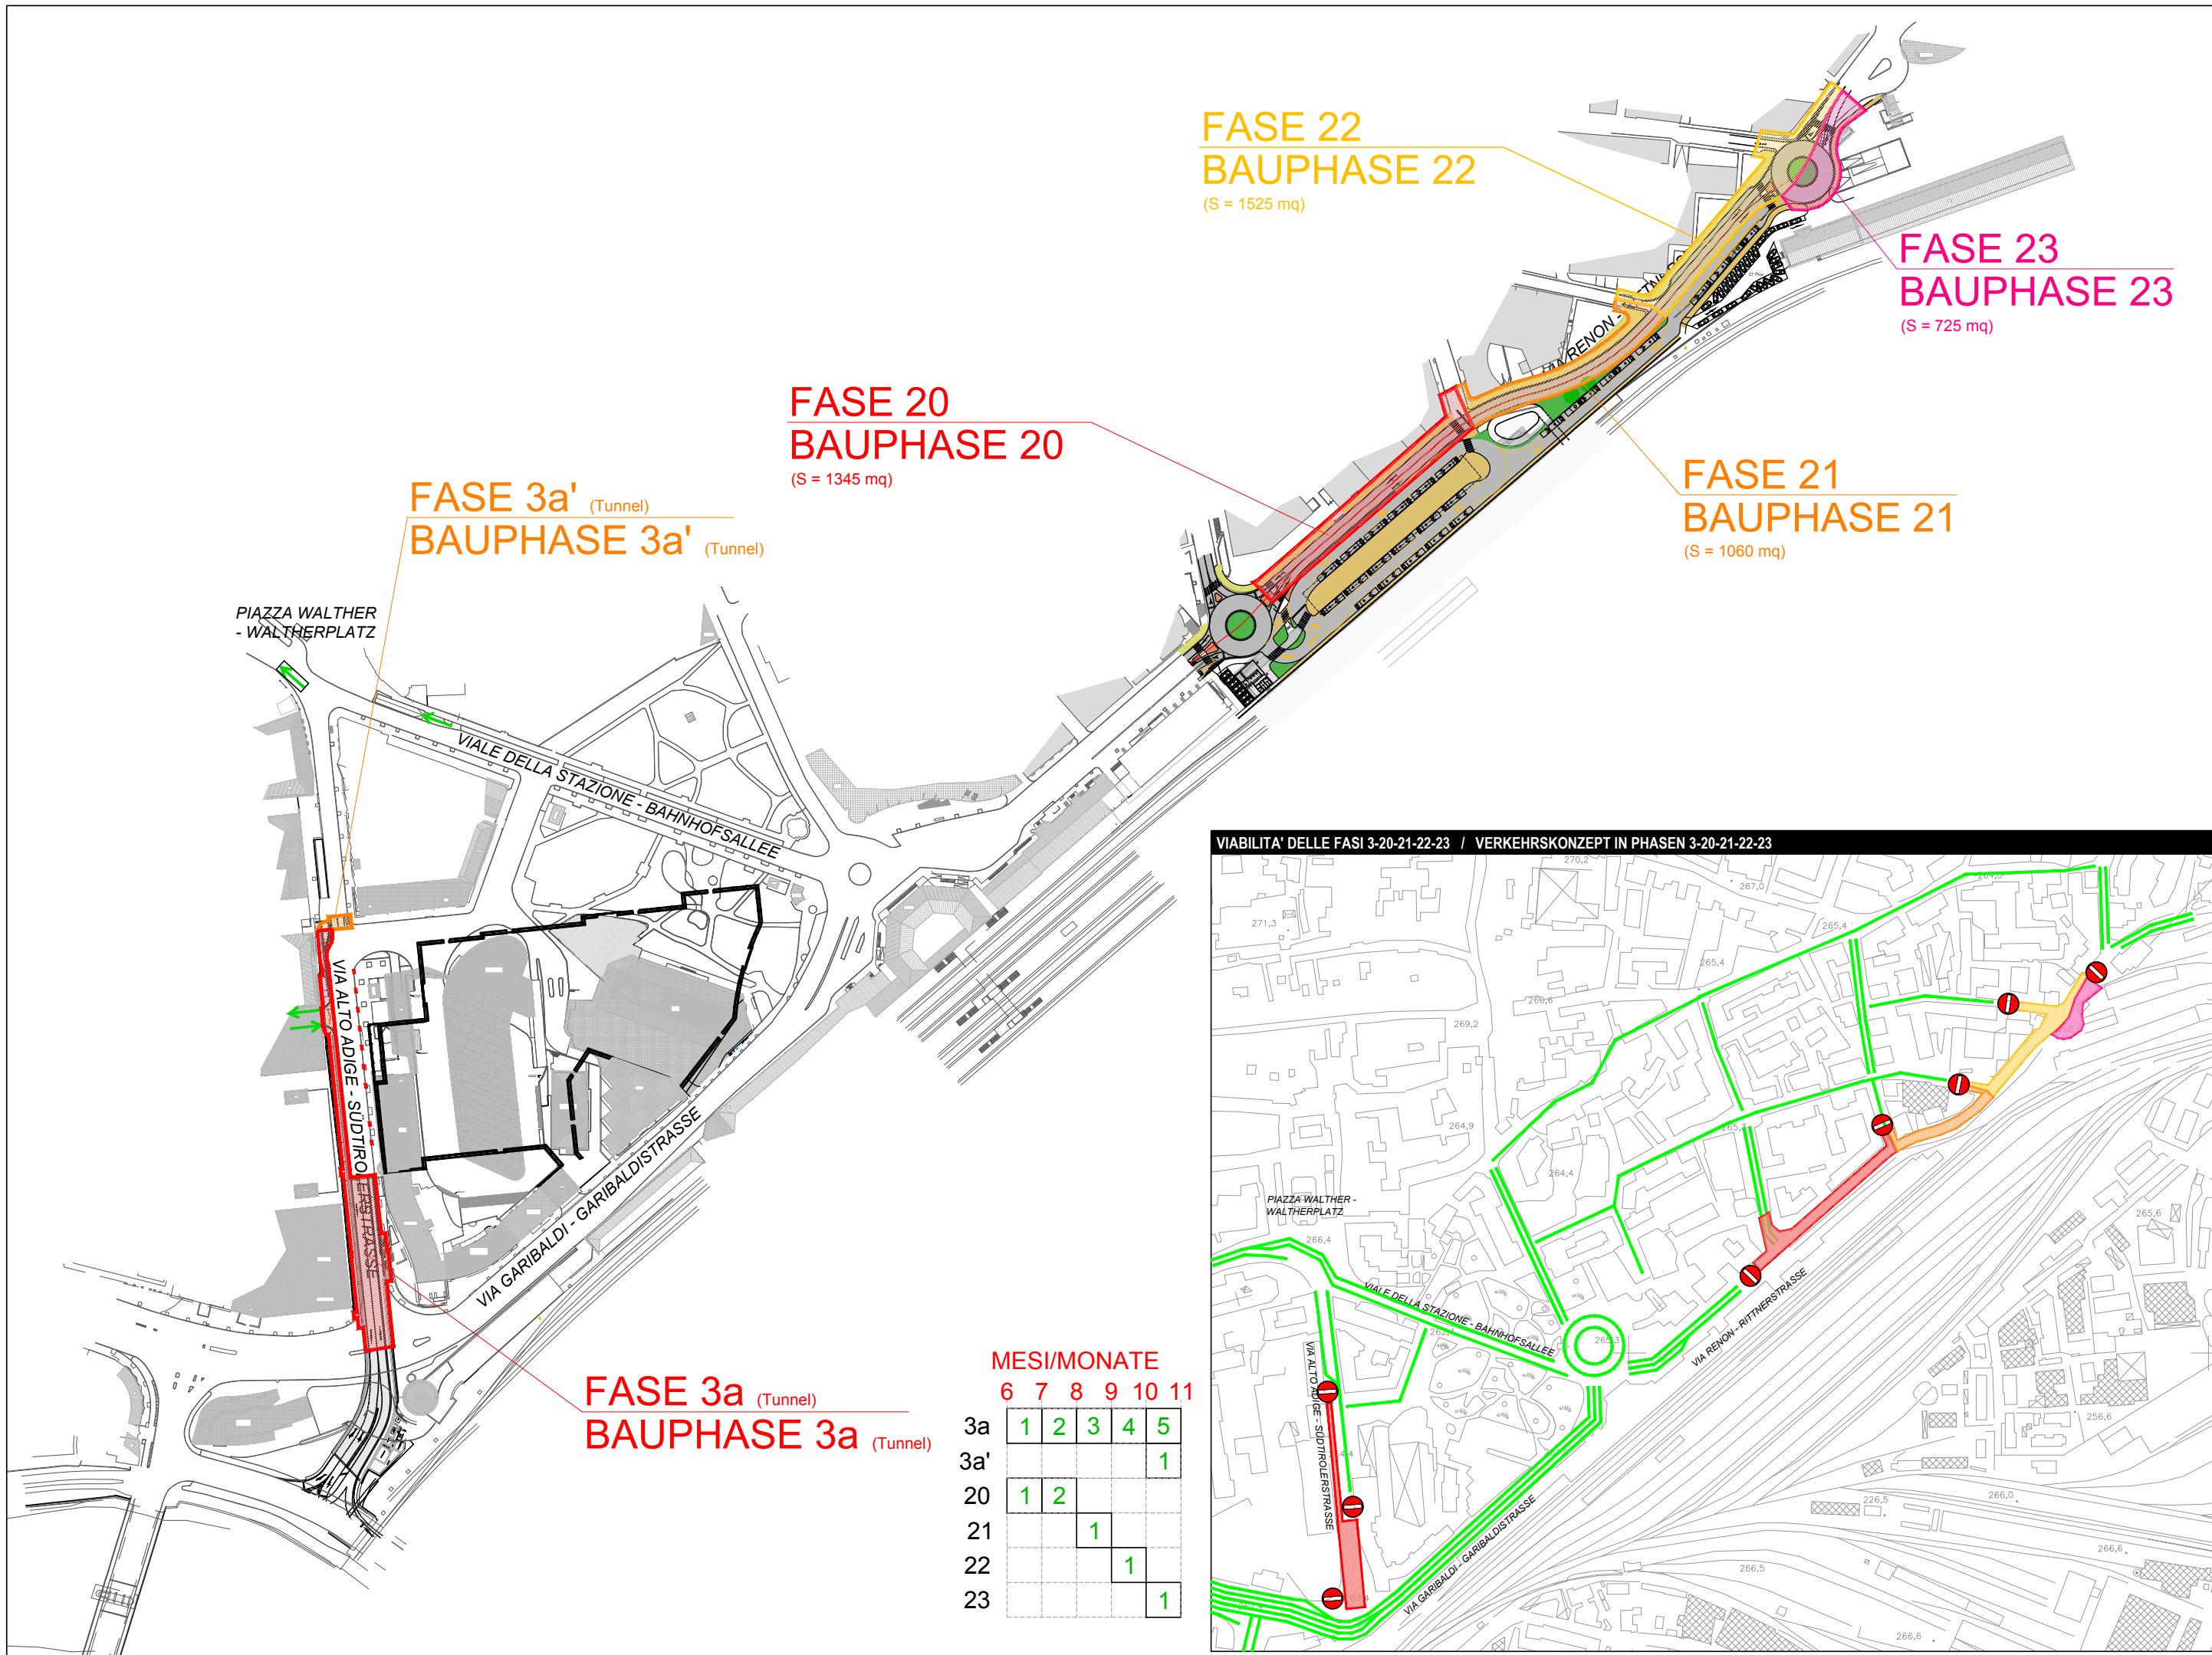

**FASE 22  
BAUPHASE 22**  
(S = 1525 mq)

**FASE 23  
BAUPHASE 23**  
(S = 725 mq)

**FASE 20  
BAUPHASE 20**  
(S = 1345 mq)


**FASE 21  
BAUPHASE 21**  
(S = 1060 mq)


**FASE 3a' (Tunnel)  
BAUPHASE 3a' (Tunnel)**

**FASE 3a (Tunnel)  
BAUPHASE 3a (Tunnel)**

MESI/MONATE  
6 7 8 9 10 11

3a	1	2	3	4	5	
3a'						1
20	1	2				
21			1			
22				1		
23						1

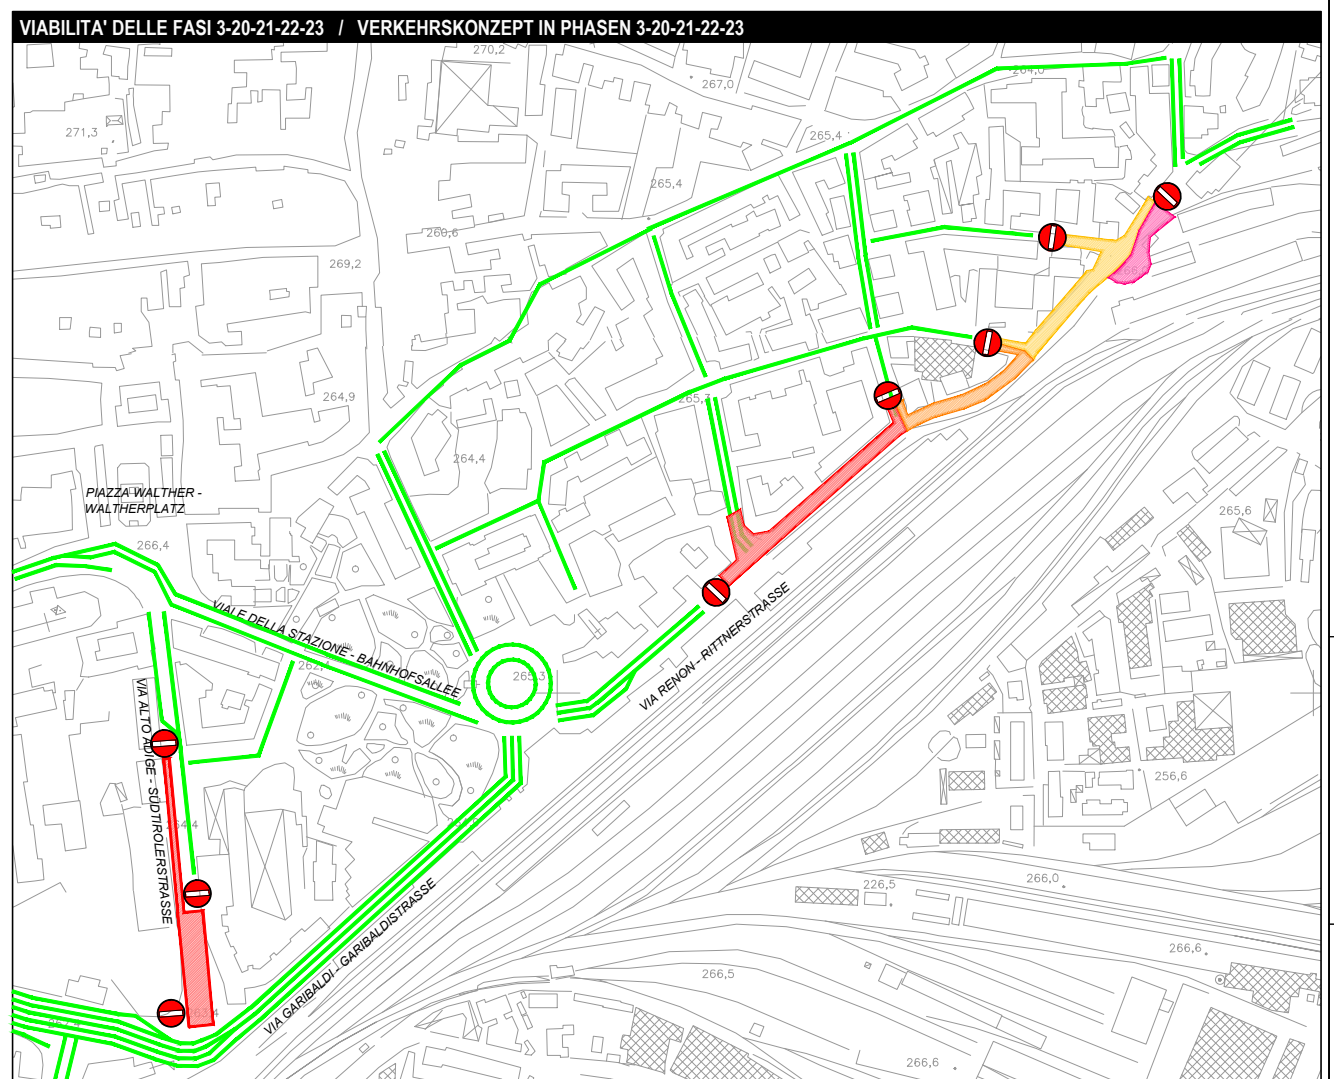


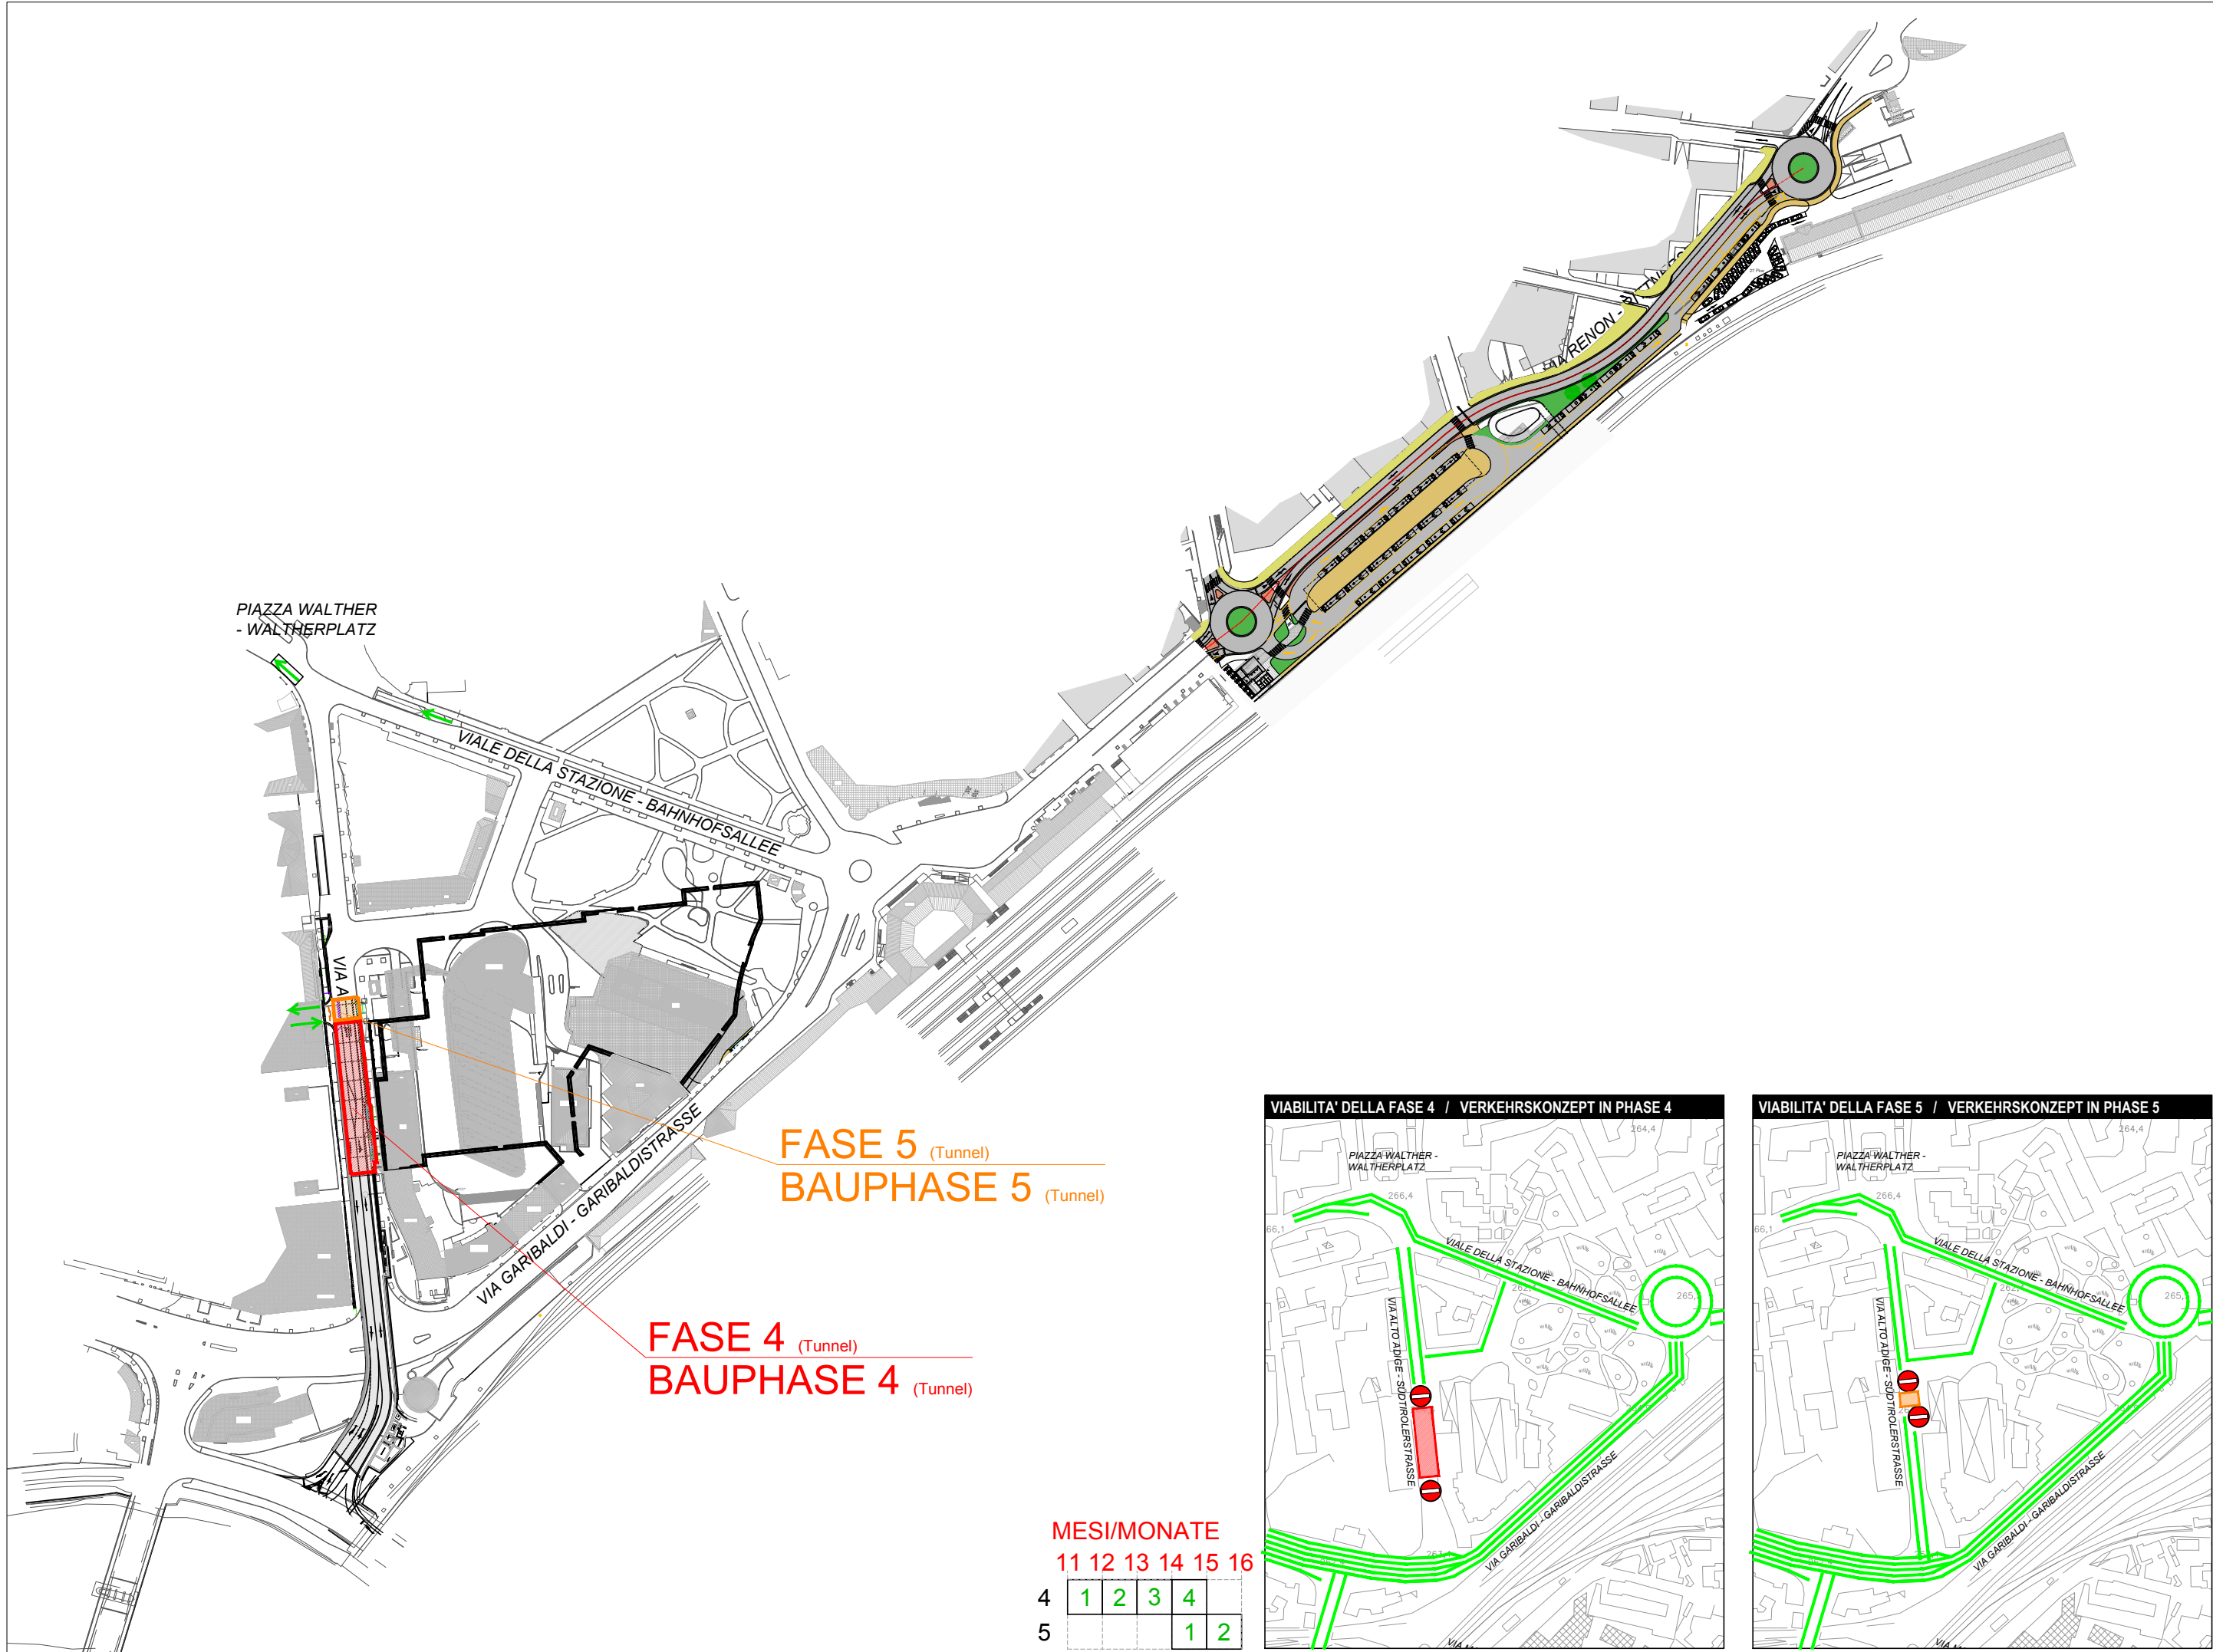


**FASE 5** (Tunnel)  
**BAUPHASE 5** (Tunnel)


**FASE 4** (Tunnel)  
**BAUPHASE 4** (Tunnel)

MESI/MONATE


	11	12	13	14	15	16
4	1	2	3	4		
5				1	2	

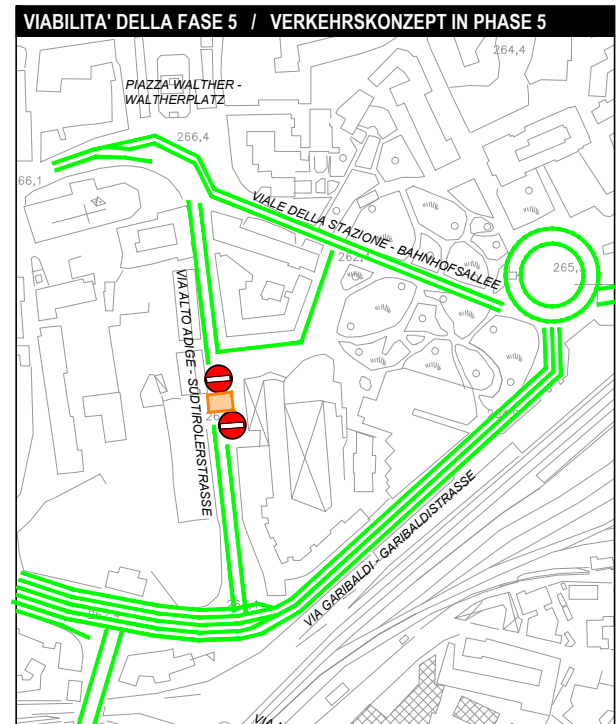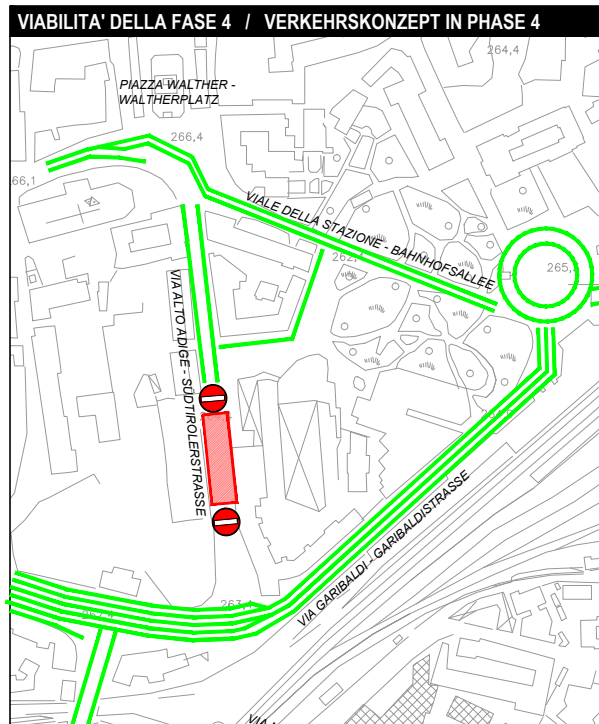


VIABILITA' DELLA FASE 5a / VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 5a

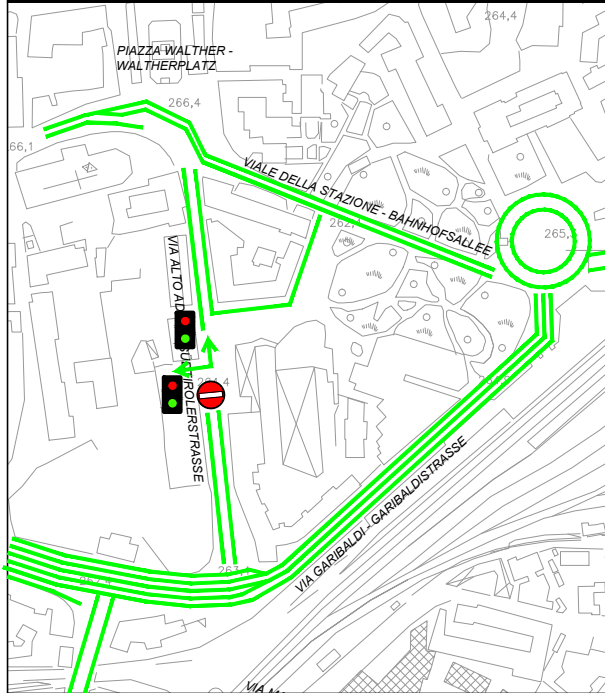


VIABILITA' DELLA FASE 5b / VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 5b

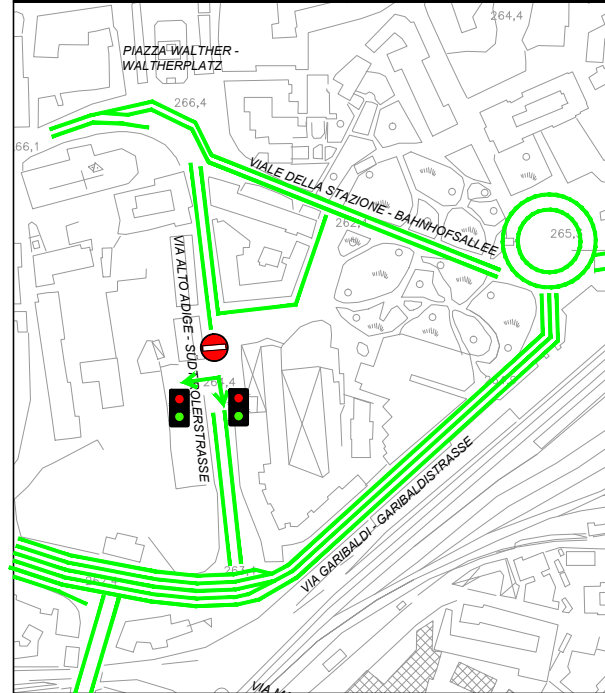

FASE 5a (Tunnel)  
BAUPHASE 5a (Tunnel)

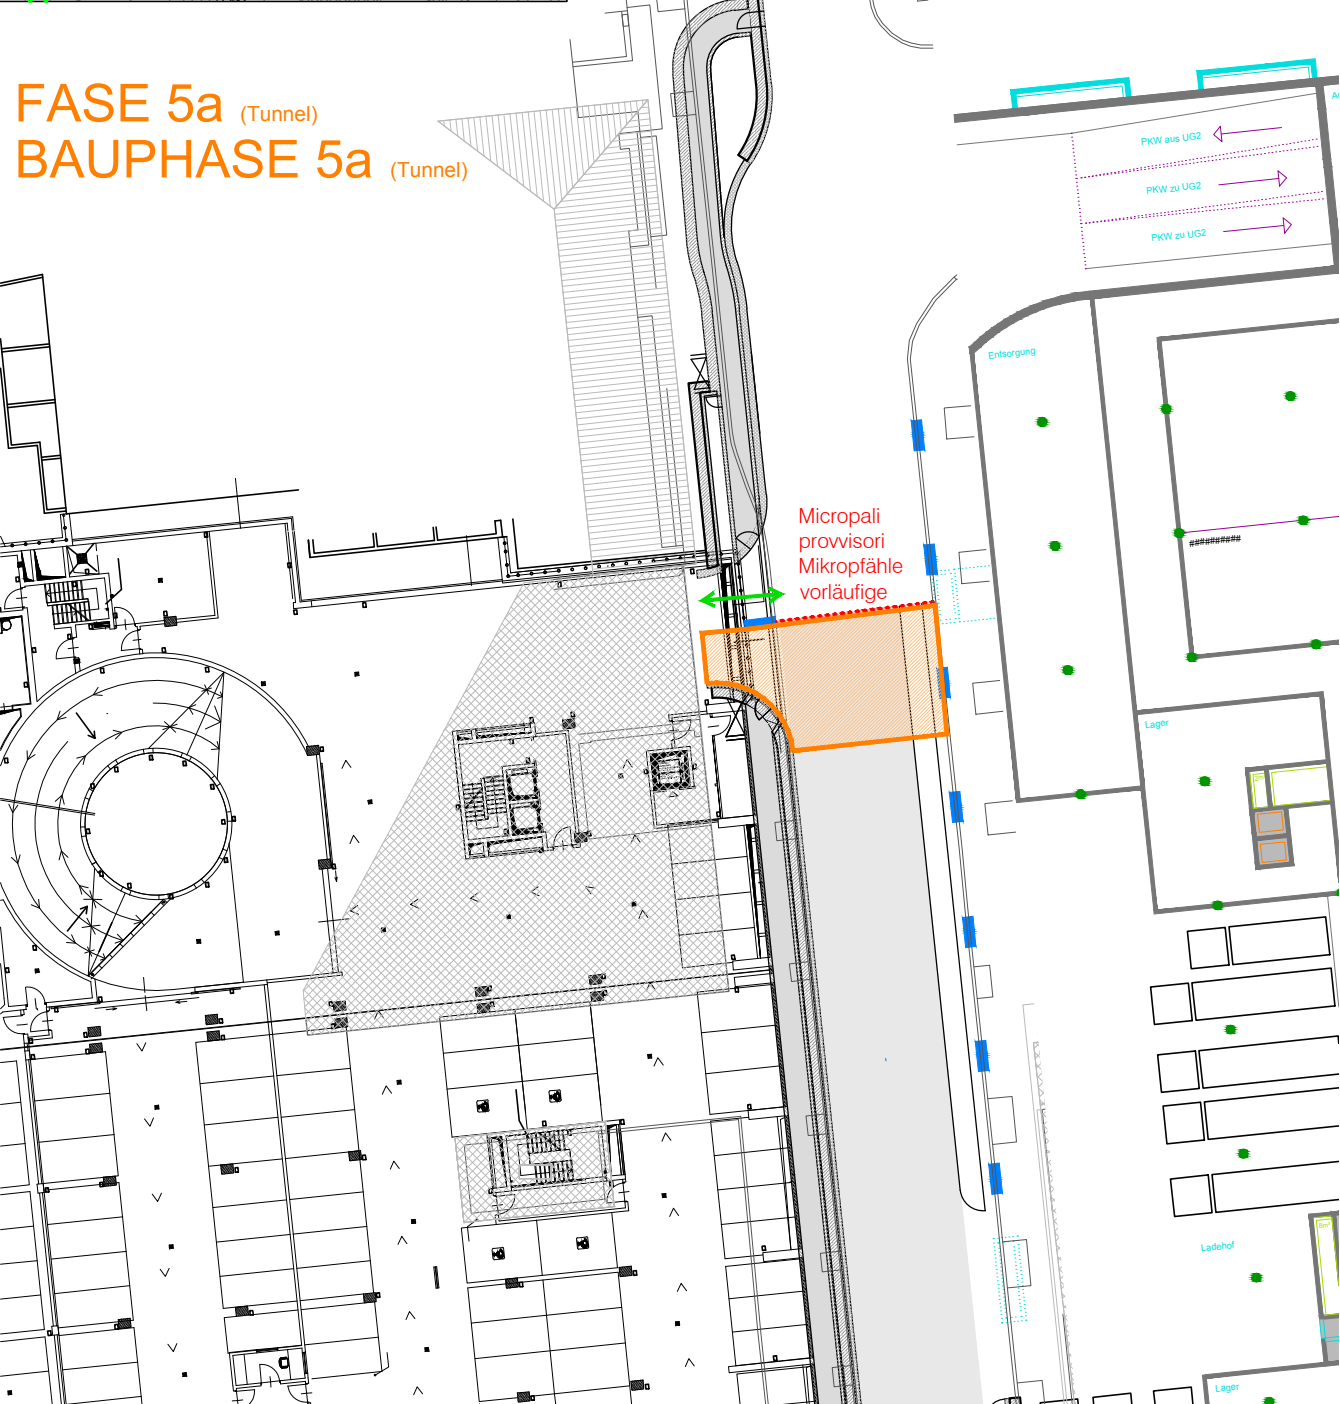


FASE 5b (Tunnel)  
BAUPHASE 5b (Tunnel)

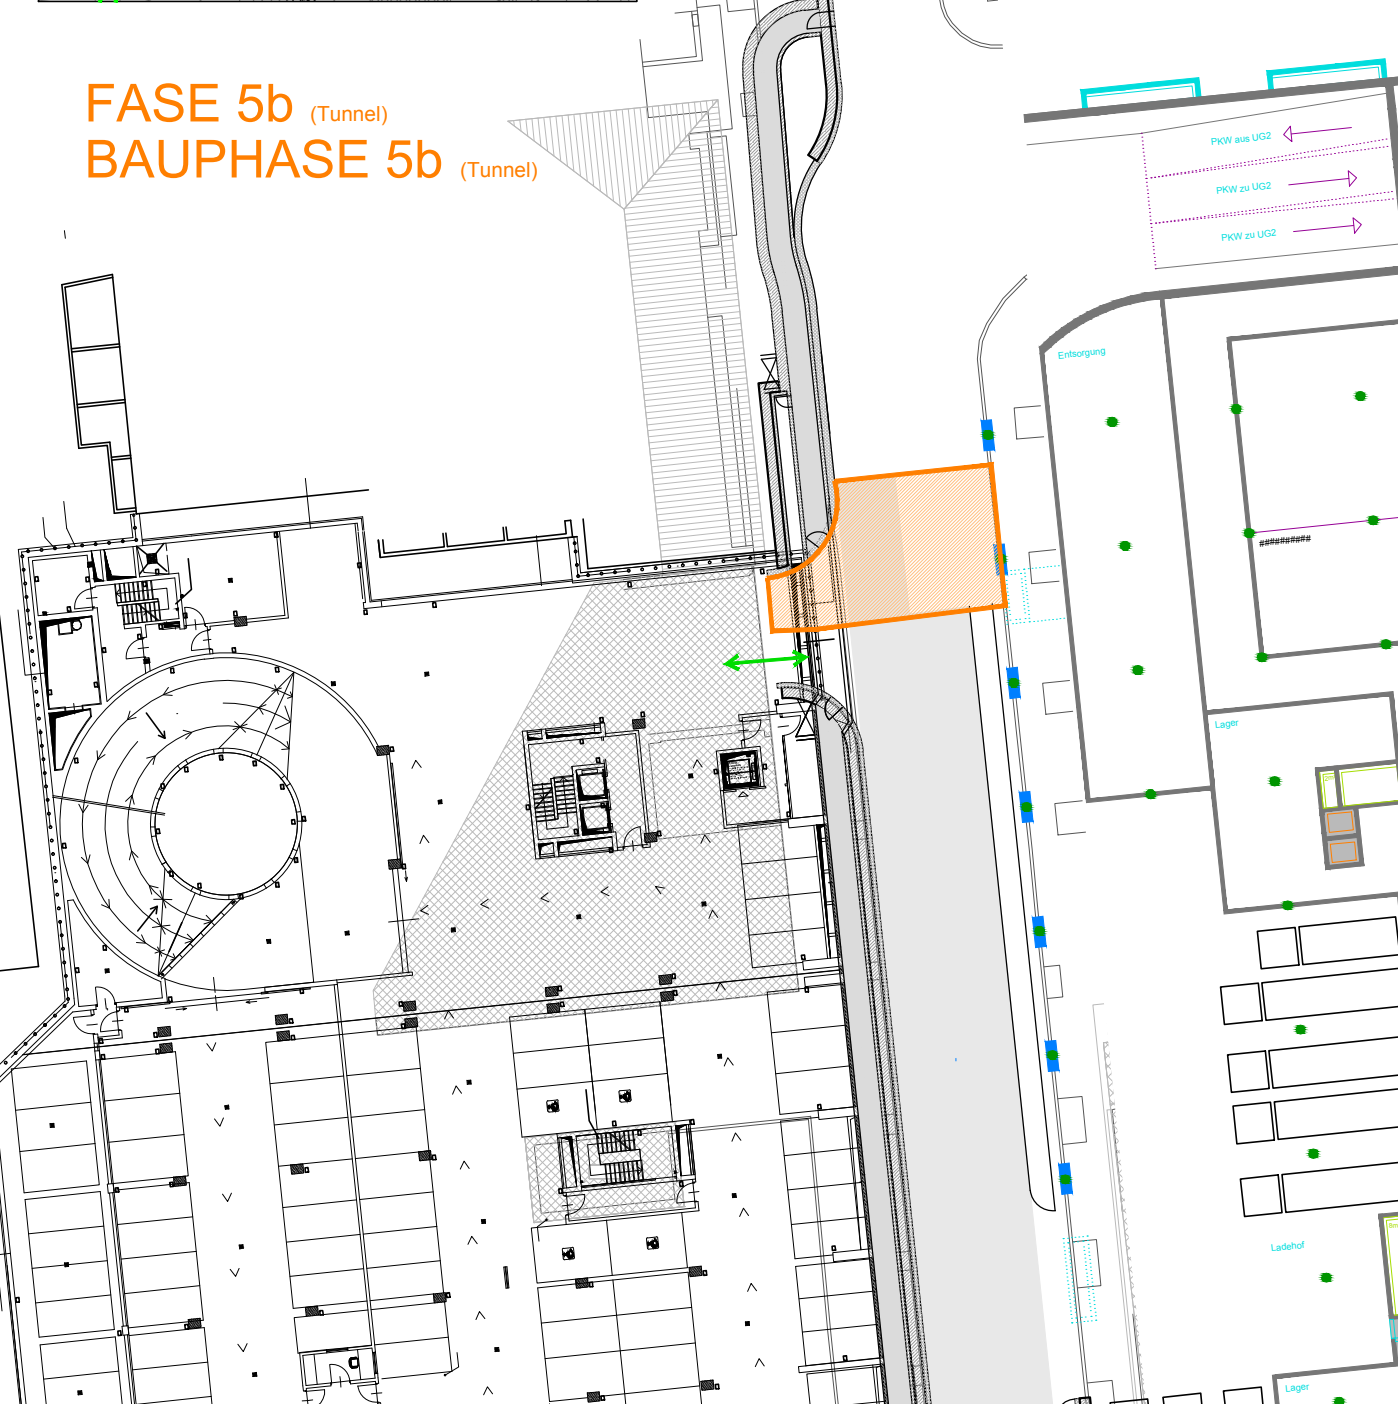

# TUNNEL COMPLETATO: 28 MESI TUNNEL FERTIG: 28 MONATE

con la fase 11 via Mayr-Nusser - mit Bauphase 11 Mayr-Nusser Strasse

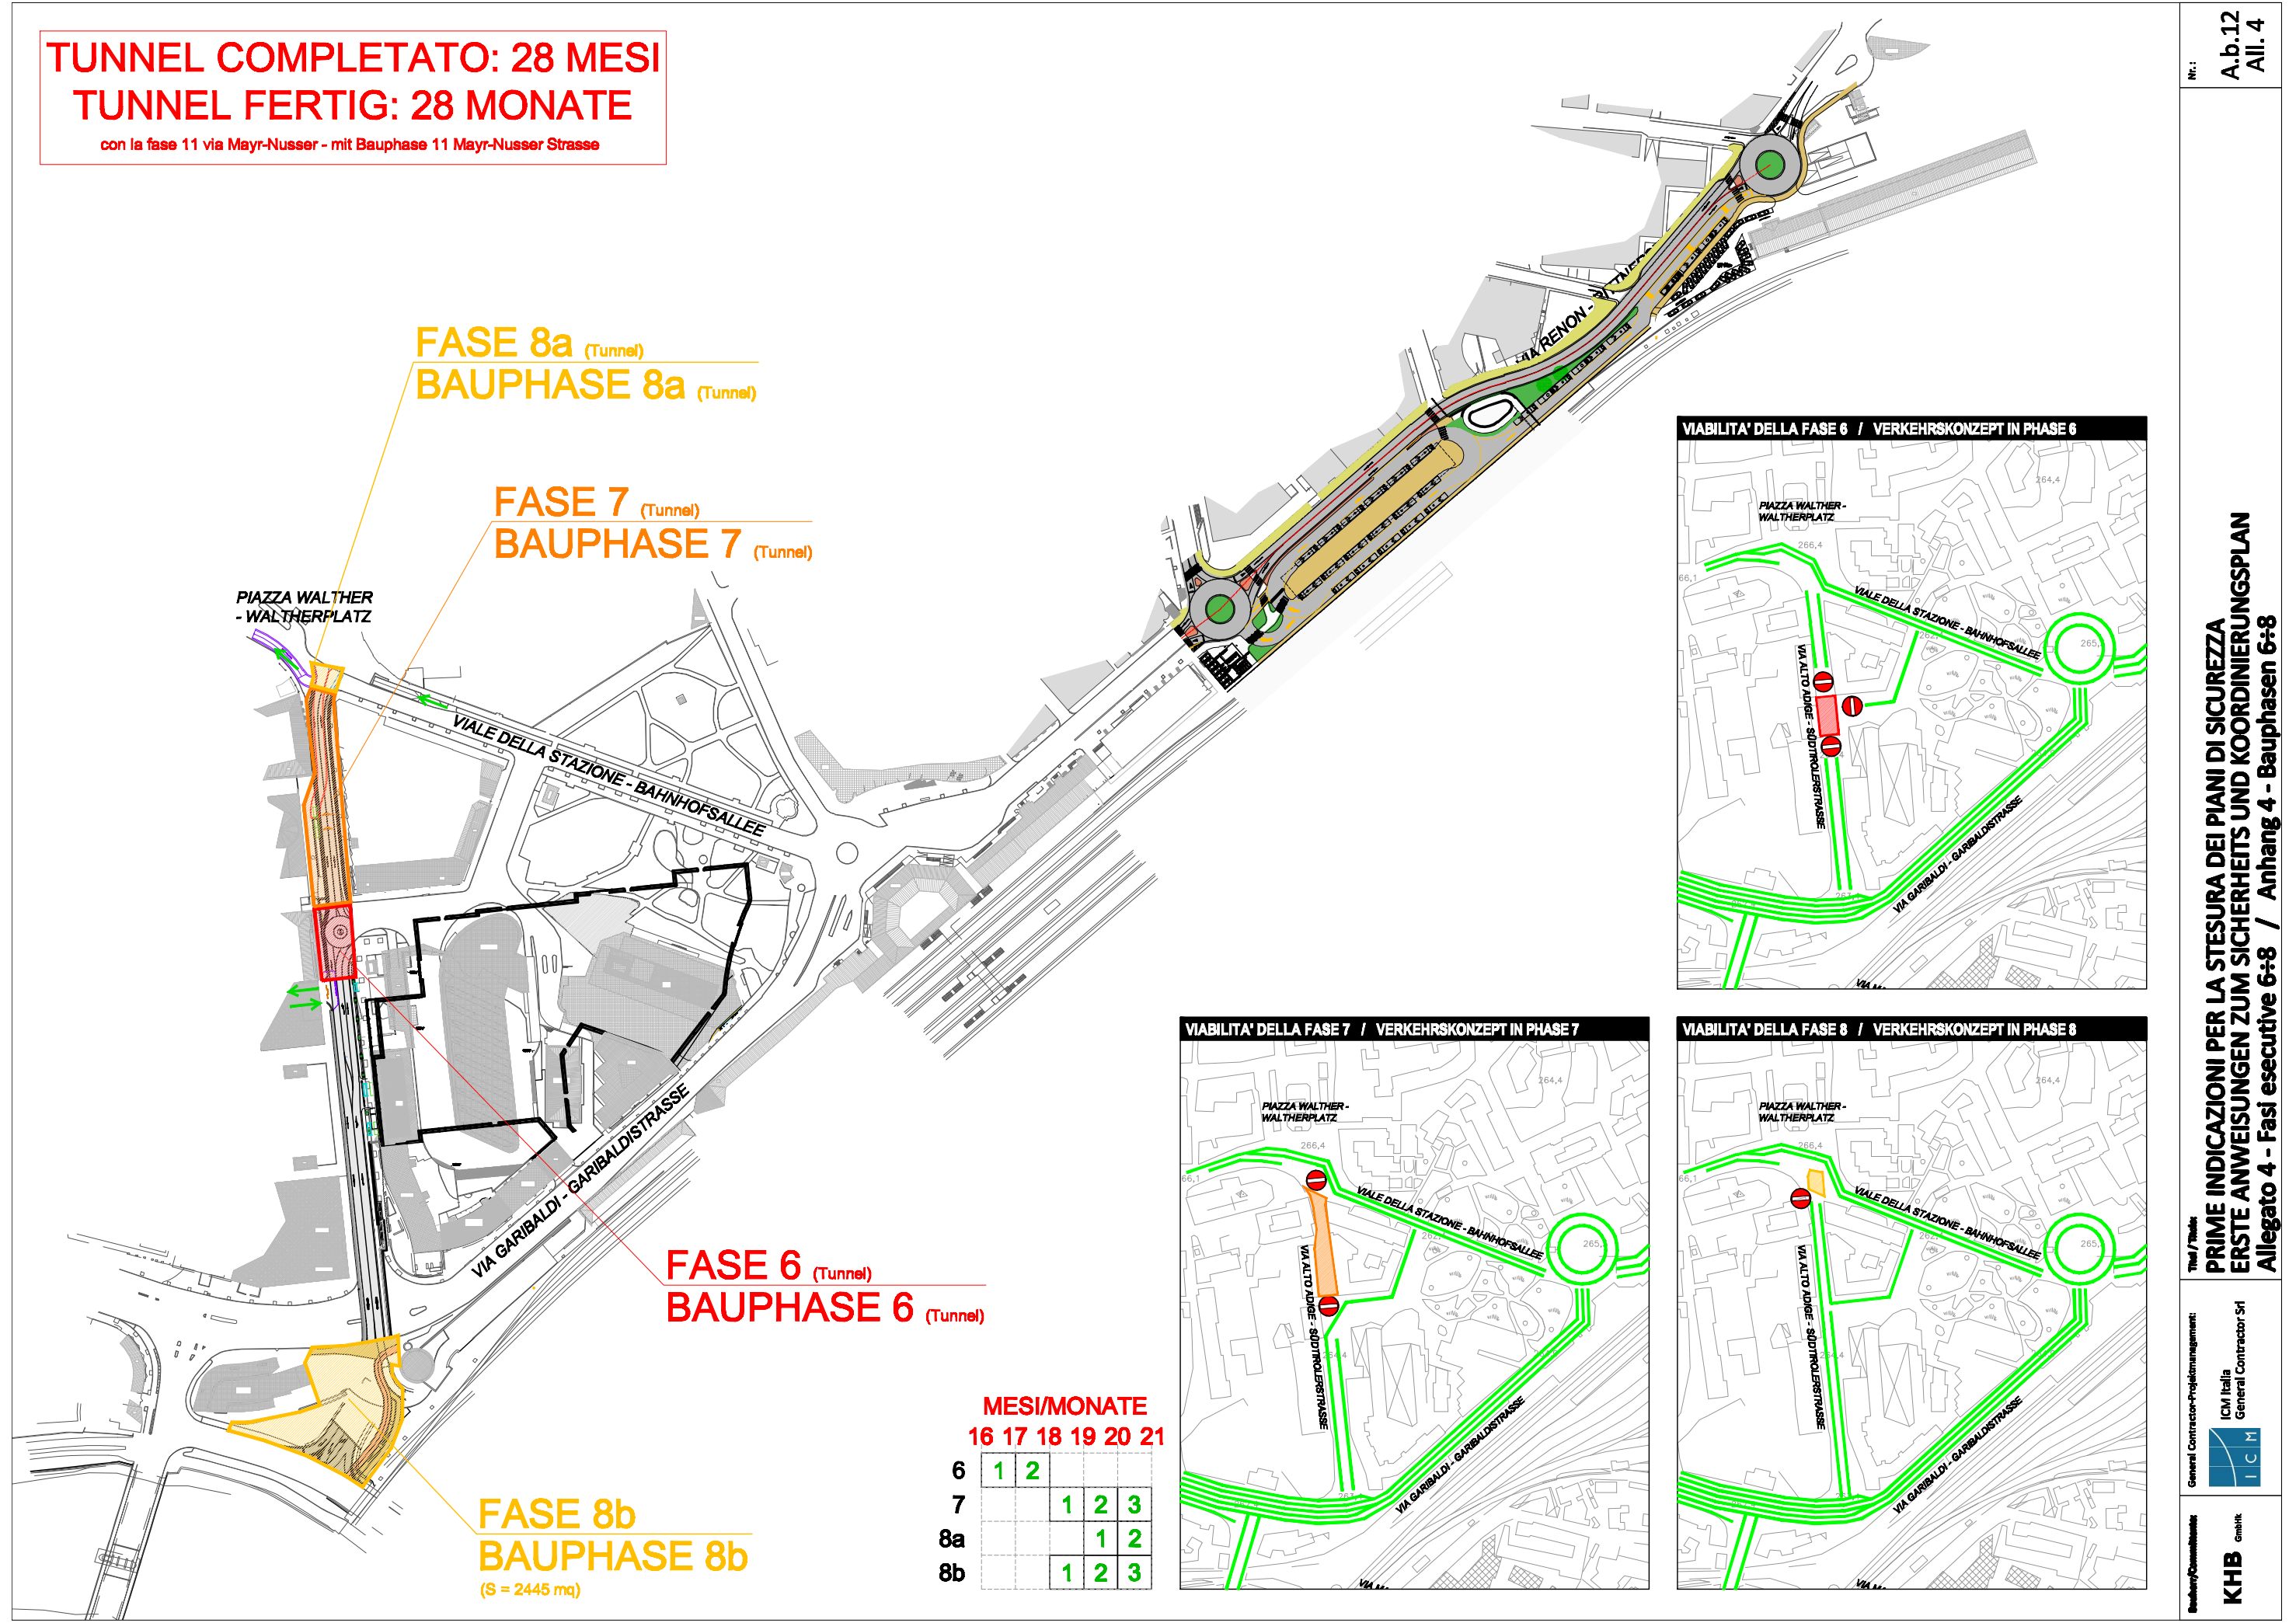

**FASE 8a** (Tunnel)  
**BAUPHASE 8a** (Tunnel)

**FASE 7** (Tunnel)  
**BAUPHASE 7** (Tunnel)

PIAZZA WALTHER - WALTHERPLATZ

VIALE DELLA STAZIONE - BAHNHOFALLEE




VIA GARIBOLDI - GARIBOLDISTRASSE

**FASE 6** (Tunnel)  
**BAUPHASE 6** (Tunnel)

**FASE 8b**  
**BAUPHASE 8b**  
(S = 2445 mq)

MESI/MONATE  
16 17 18 19 20 21

6	1	2			
7			1	2	3
8a				1	2
8b				1	2

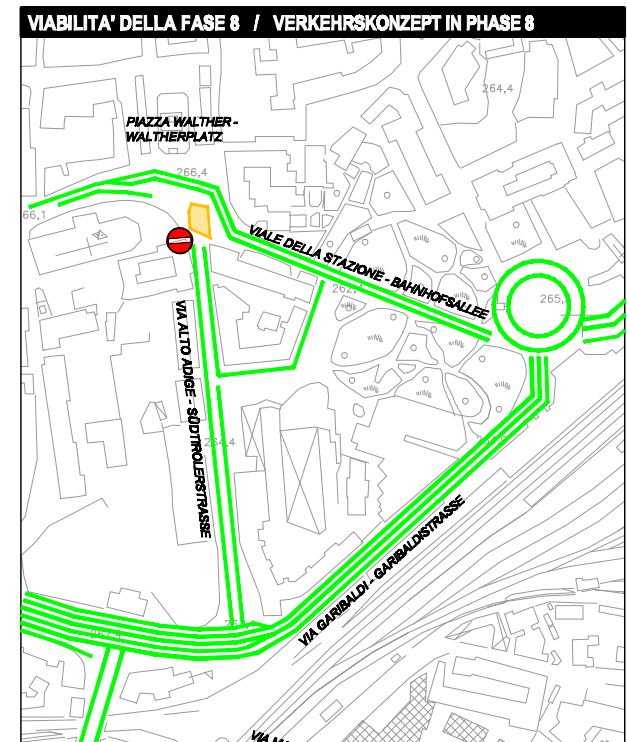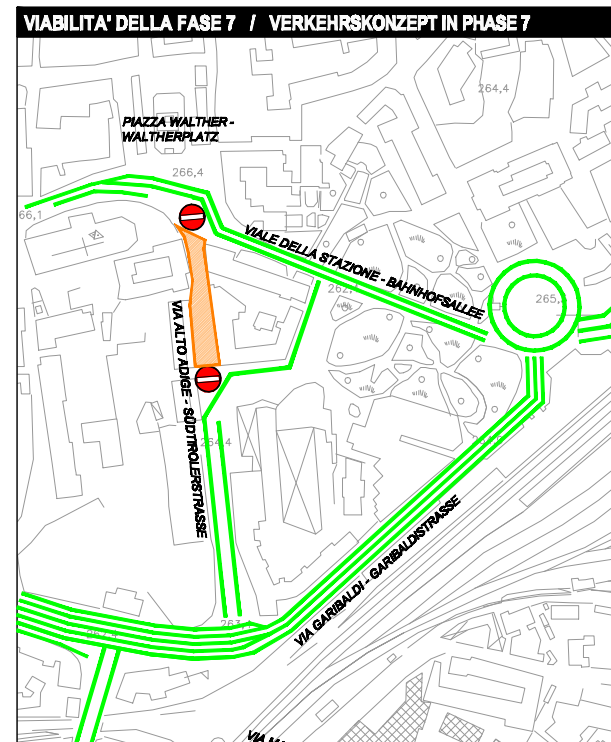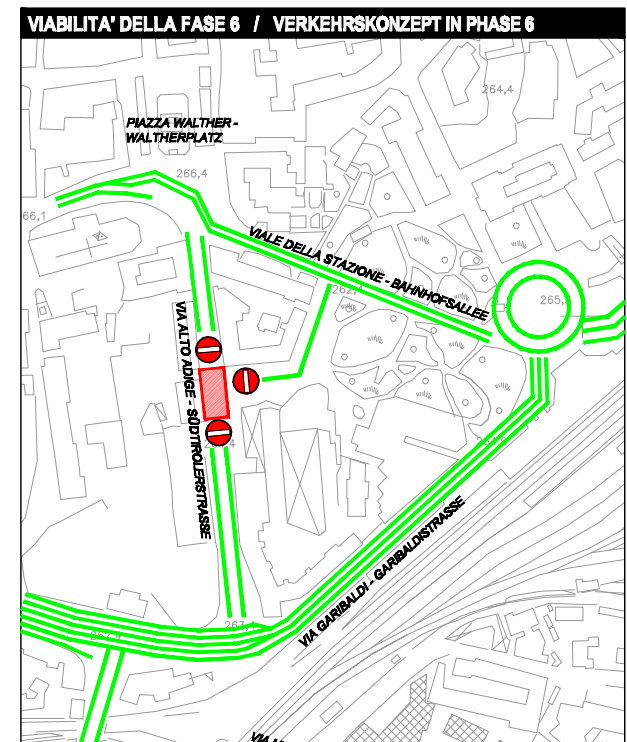



**FASE 12a**  
**BAUPHASE 12a**  
(S = 1990 mq)

**FASE 12b**  
**BAUPHASE 12b**  
(S = 1800 mq)

**FASE 11**  
**BAUPHASE 11**  
(S = 2695 mq)

**FASE 9b**  
**BAUPHASE 9b**  
(S = 1170 mq)

**FASE 9a**  
**BAUPHASE 9a**  
(S = 455 mq)

**FASE 10a**  
**BAUPHASE 10a**  
(S = 510 mq)





**FASE 10a'**  
**BAUPHASE 10a'**  
(S = 455 mq)


**FASE 10b**  
**BAUPHASE 10b**  
(S = 520 mq)

**TUNNEL COMPLETATO: 28 MESI**  
**TUNNEL FERTIG: 28 MONATE**  
con la fase 11 via Mayr-Nusser  
mit Bauphase 11 Mayr-Nusser Strasse

MESI/MONATE  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10a	1	2	3								
10a'		1	2	3							
10b				1	2						
11						1	2				
12a					1	2					
12b						1	2				
9a								1	2	3	
9b									1	2	

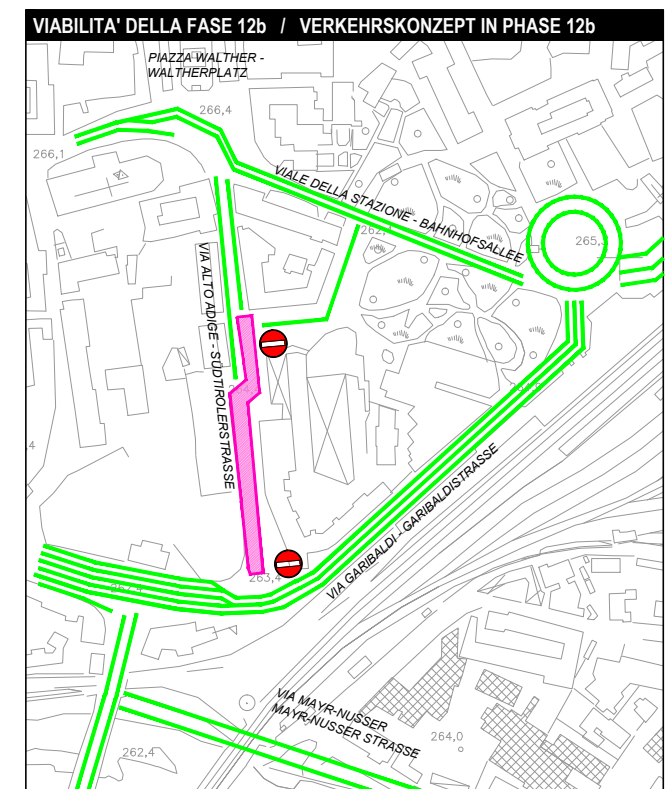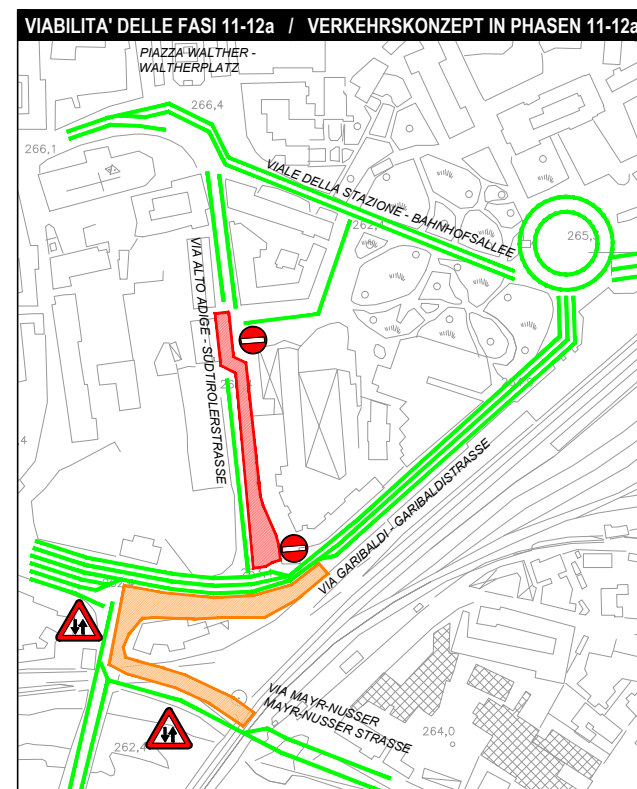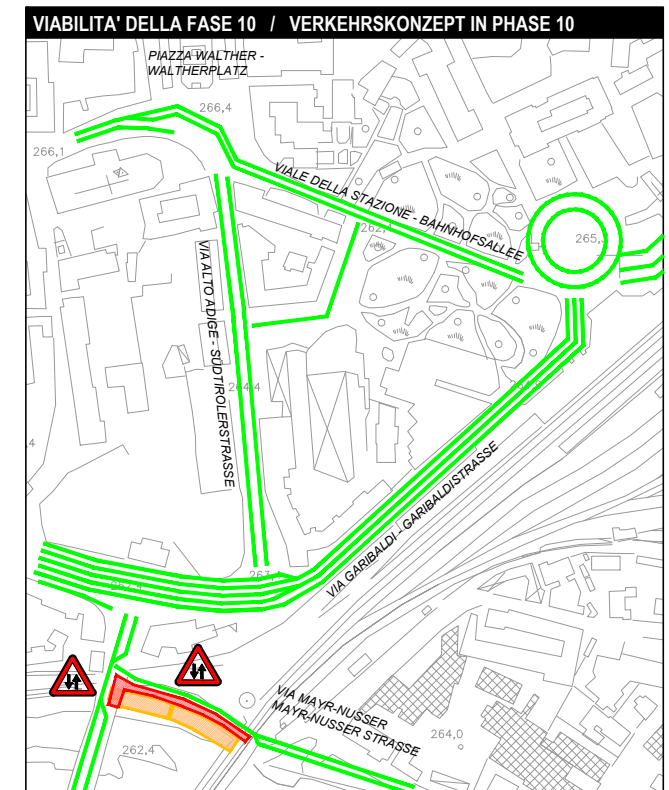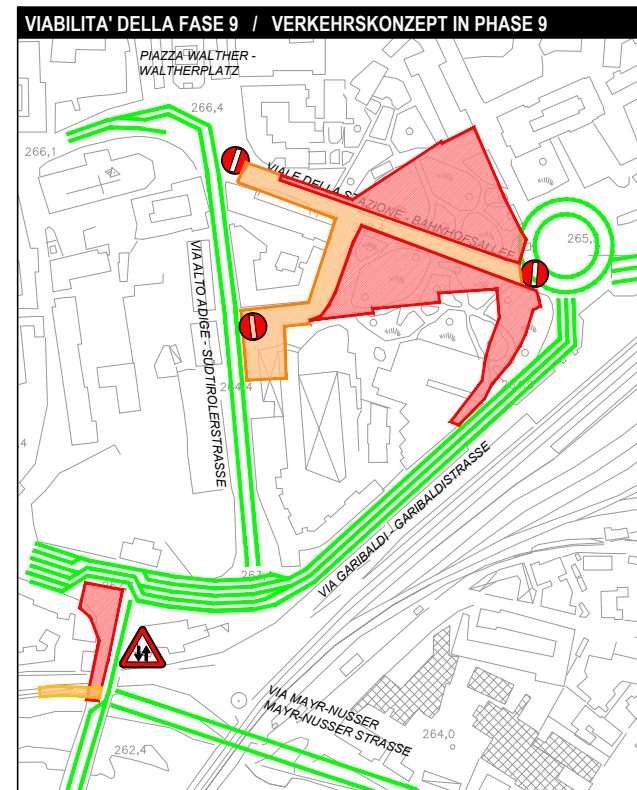

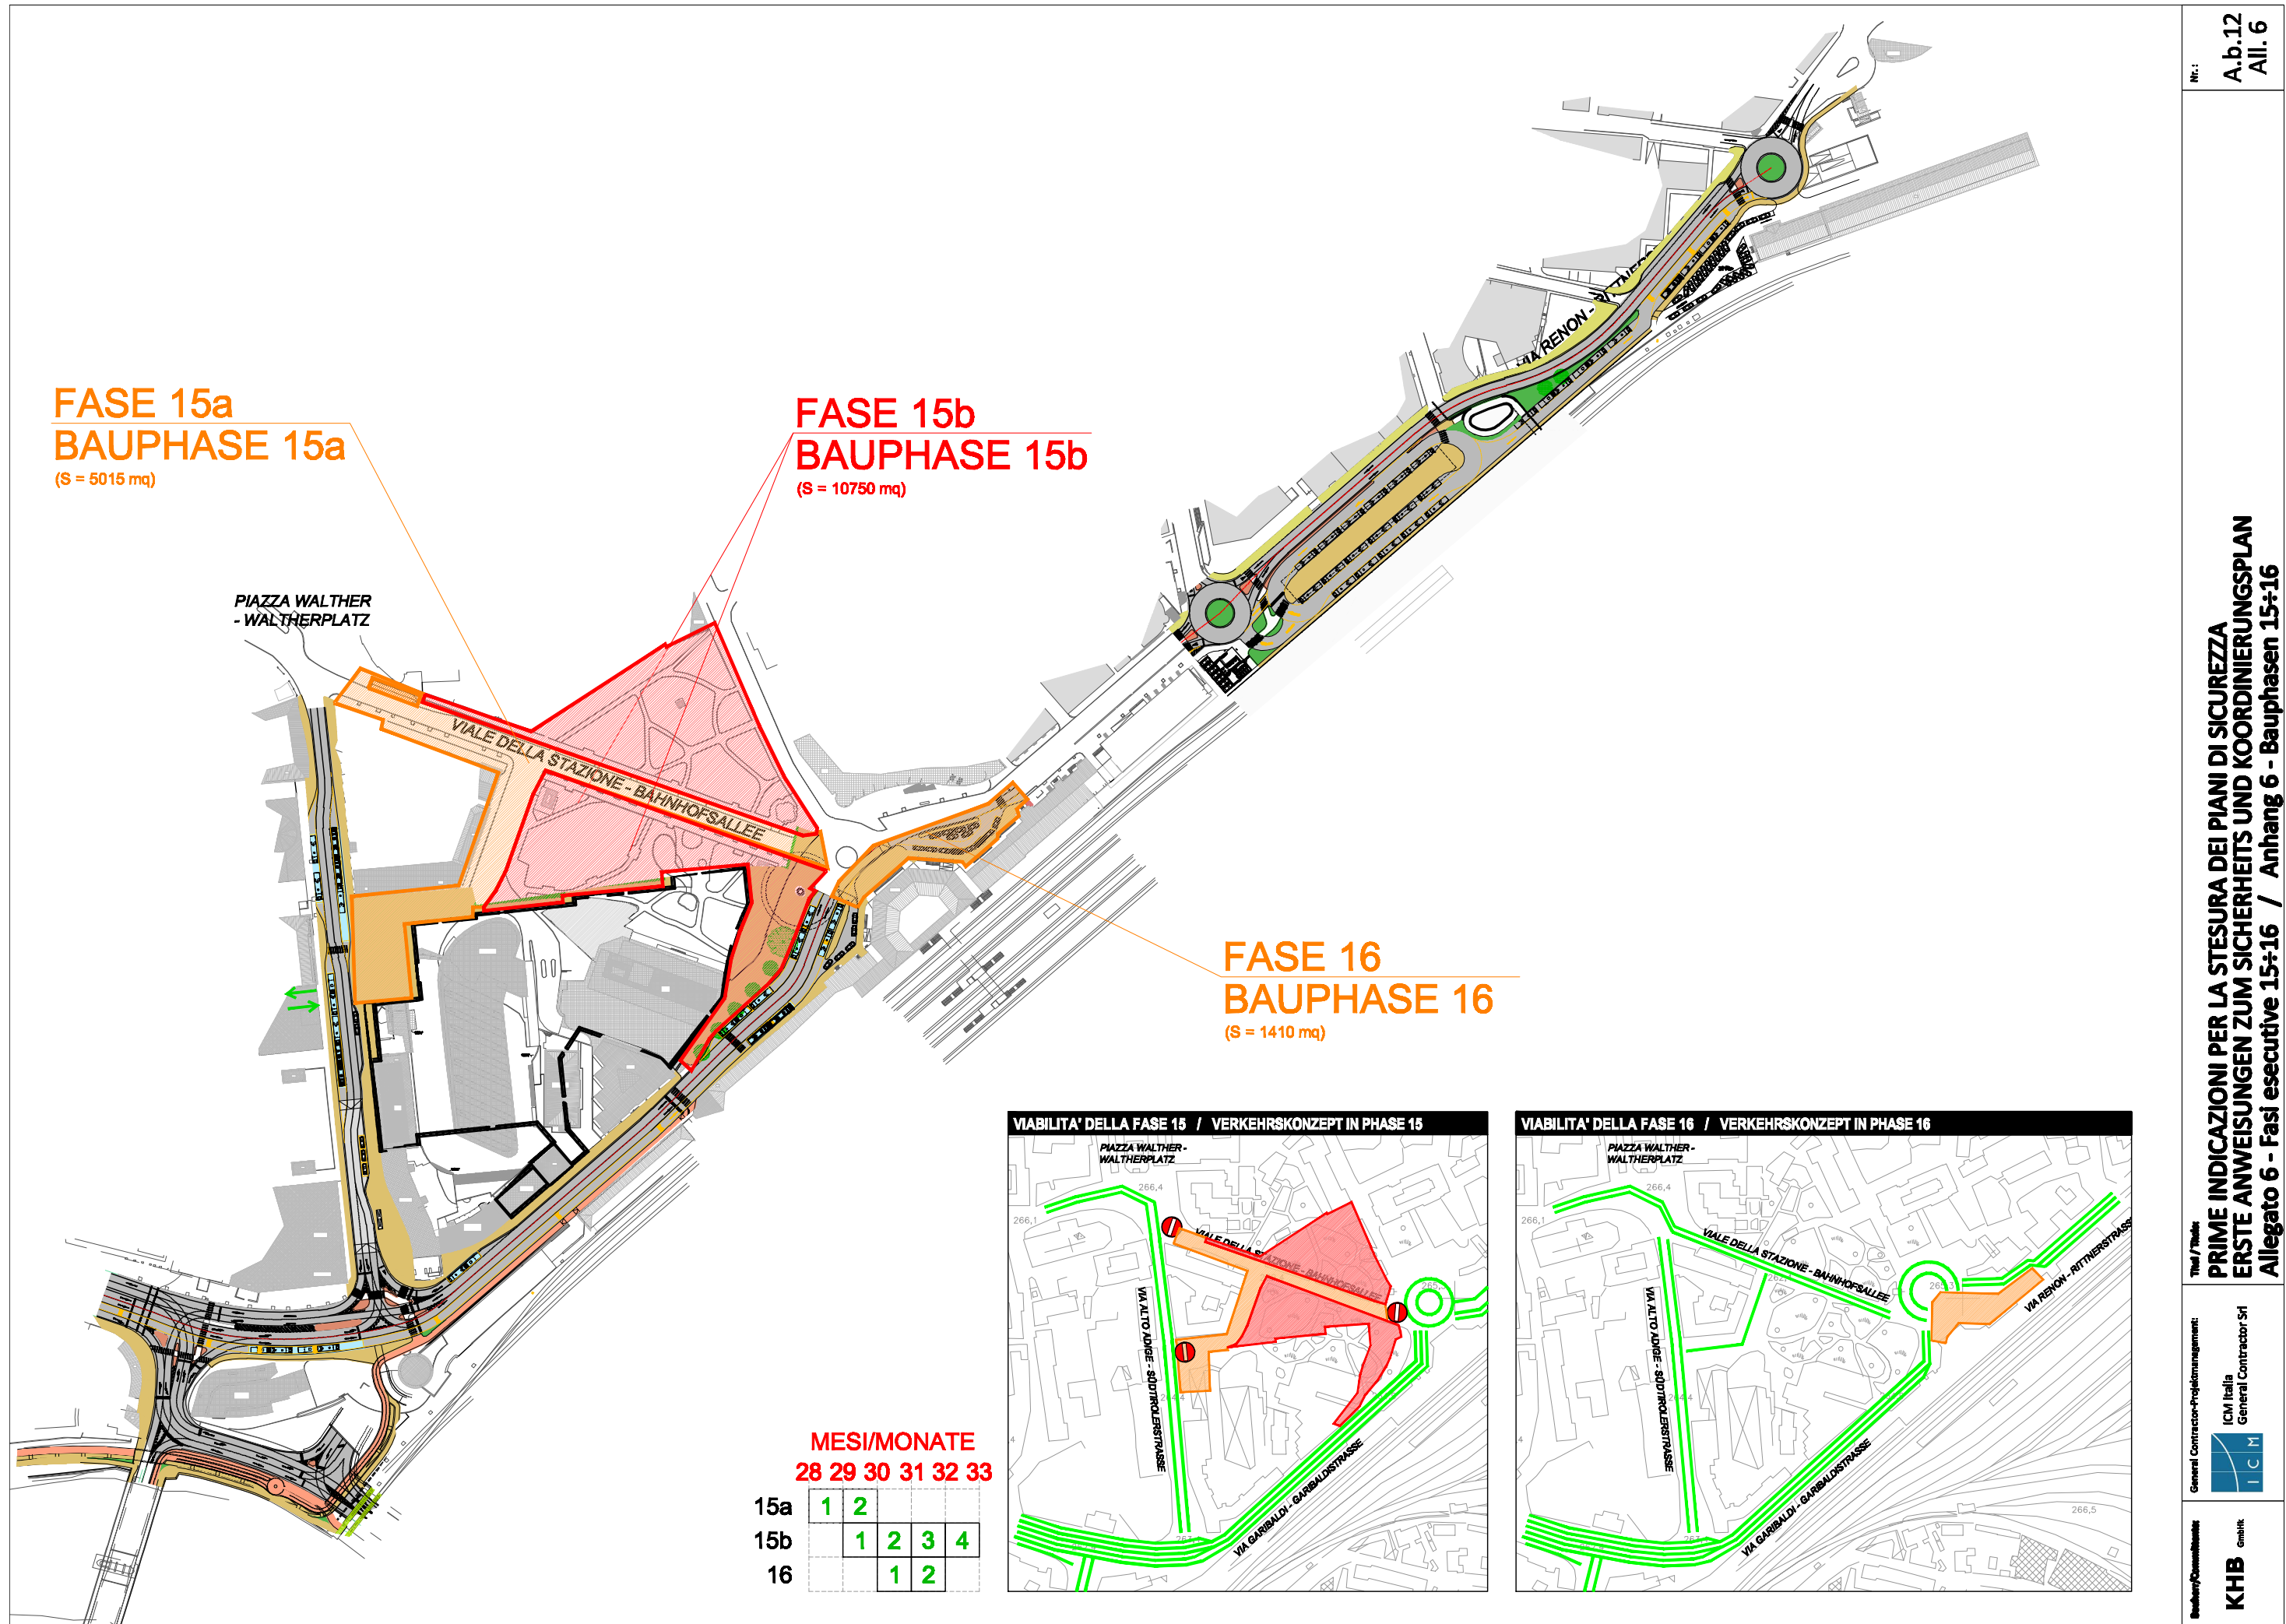



**FASE 15a**  
**BAUPHASE 15a**  
 (S = 5015 mq)


**FASE 15b**  
**BAUPHASE 15b**  
 (S = 10750 mq)

**FASE 16**  
**BAUPHASE 16**  
 (S = 1410 mq)

**MESI/MONATE**  
 28 29 30 31 32 33

15a	1	2				
15b		1	2	3	4	
16			1	2		

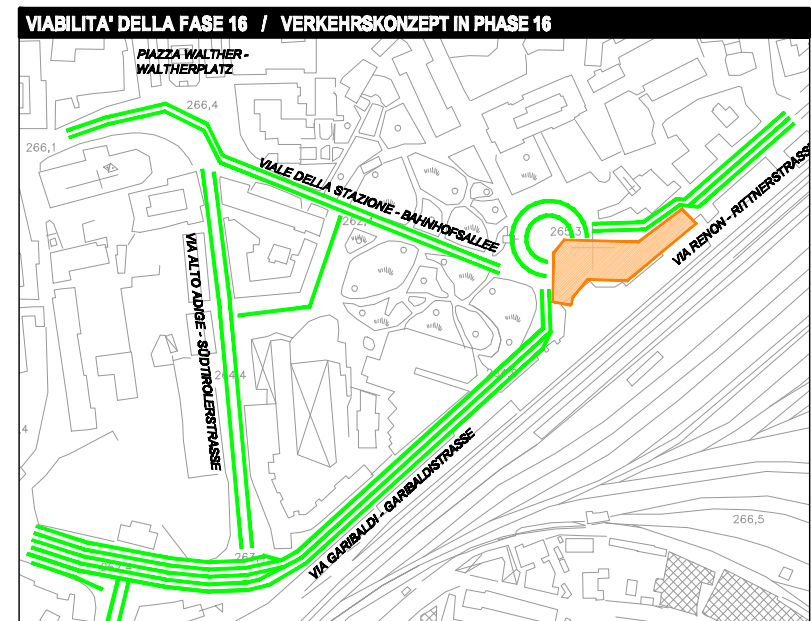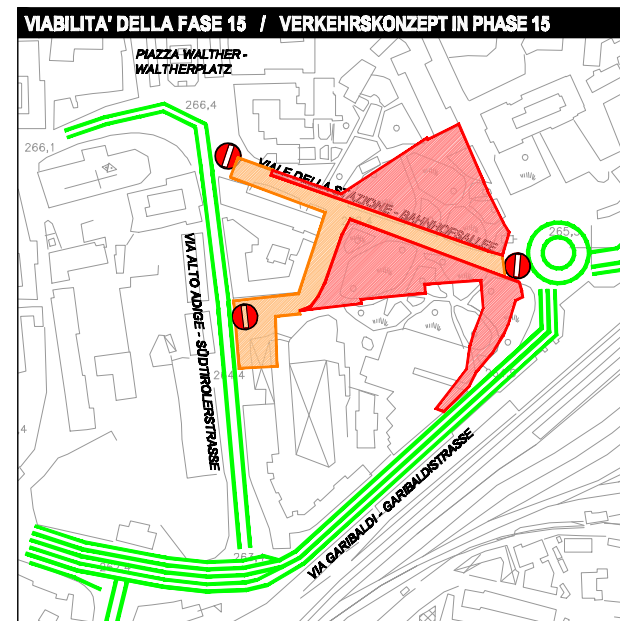

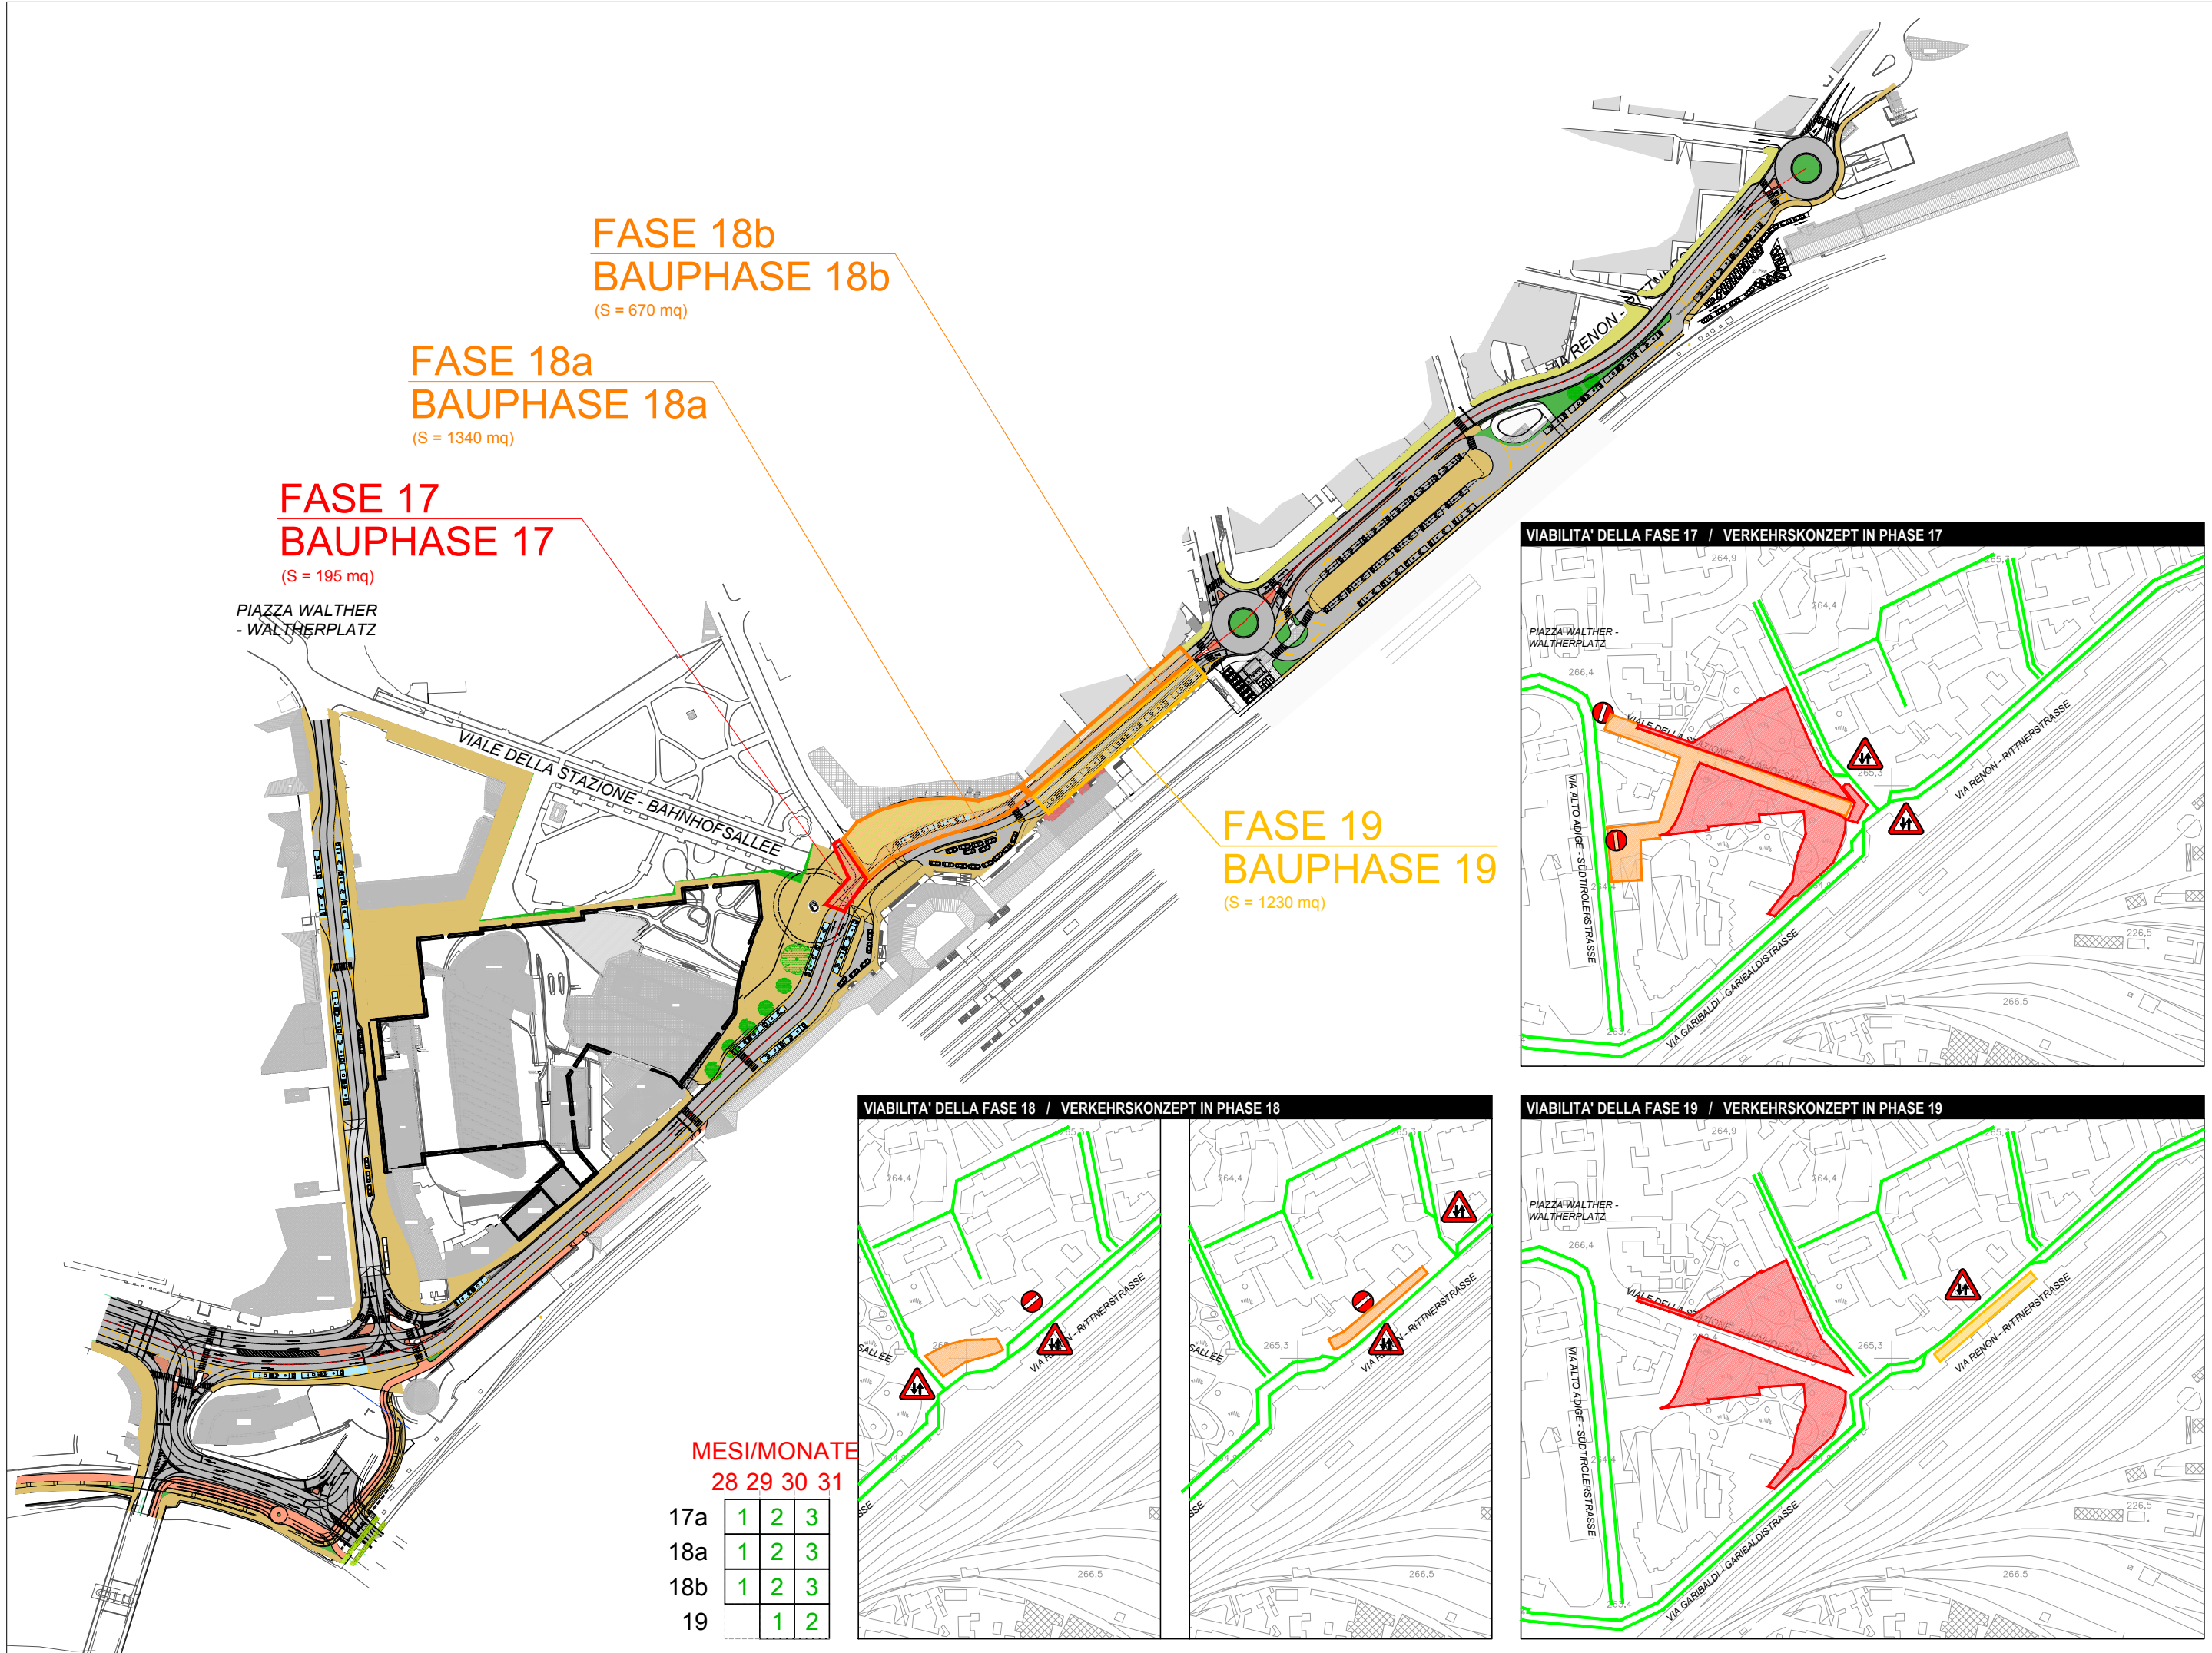

**FASE 18b**  
**BAUPHASE 18b**  
 (S = 670 mq)

**FASE 18a**  
**BAUPHASE 18a**  
 (S = 1340 mq)


**FASE 17**  
**BAUPHASE 17**  
 (S = 195 mq)

**FASE 19**  
**BAUPHASE 19**  
 (S = 1230 mq)


PIAZZA WALTHER  
 - WALTHERPLATZ

VIALE DELLA STAZIONE - BAHNHOFSSALLEE


VIABILITA' DELLA FASE 17 / VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 17

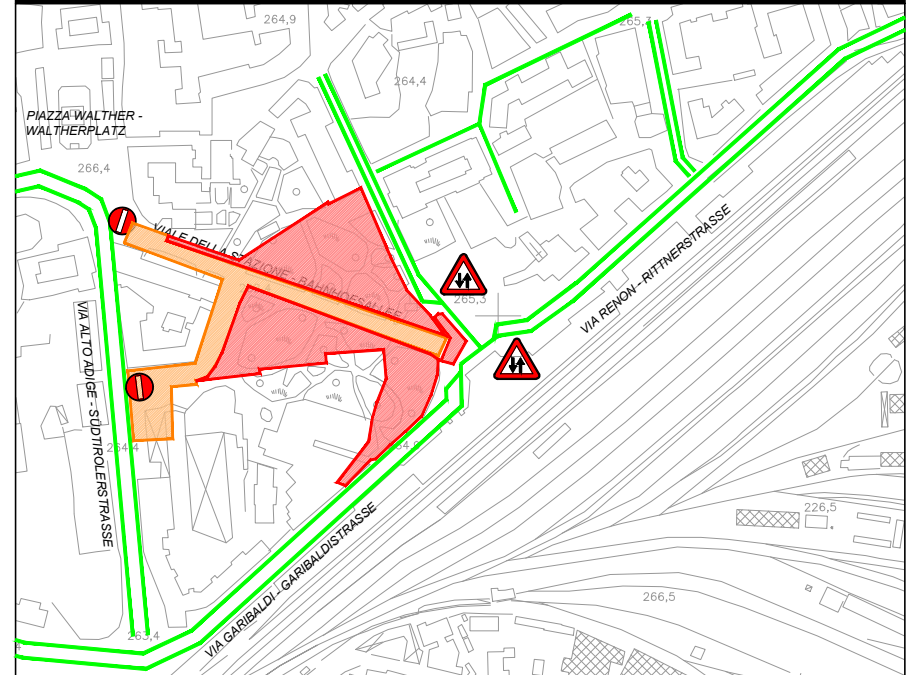

VIABILITA' DELLA FASE 18 / VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 18

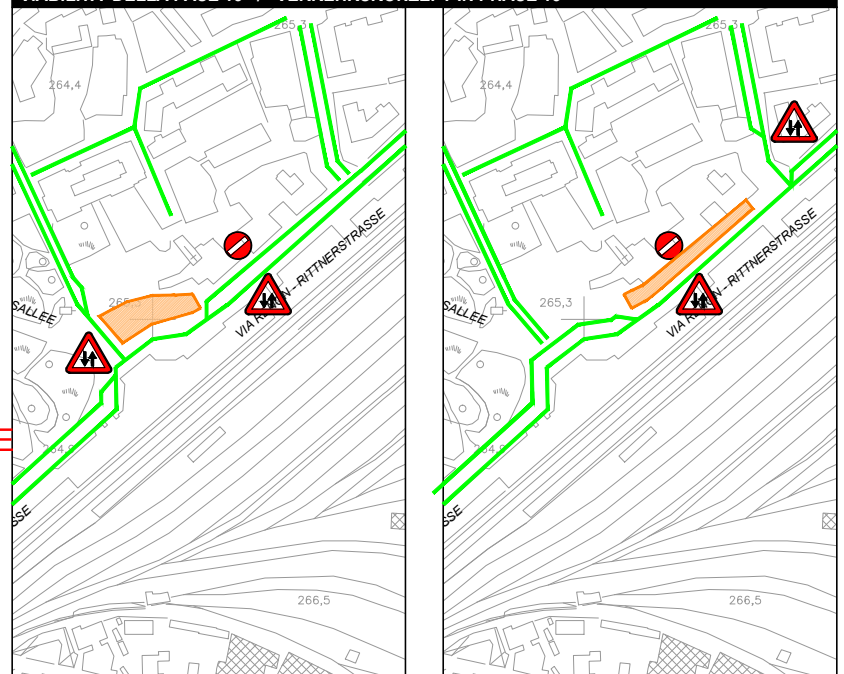


VIABILITA' DELLA FASE 19 / VERKEHRSKONZEPT IN PHASE 19

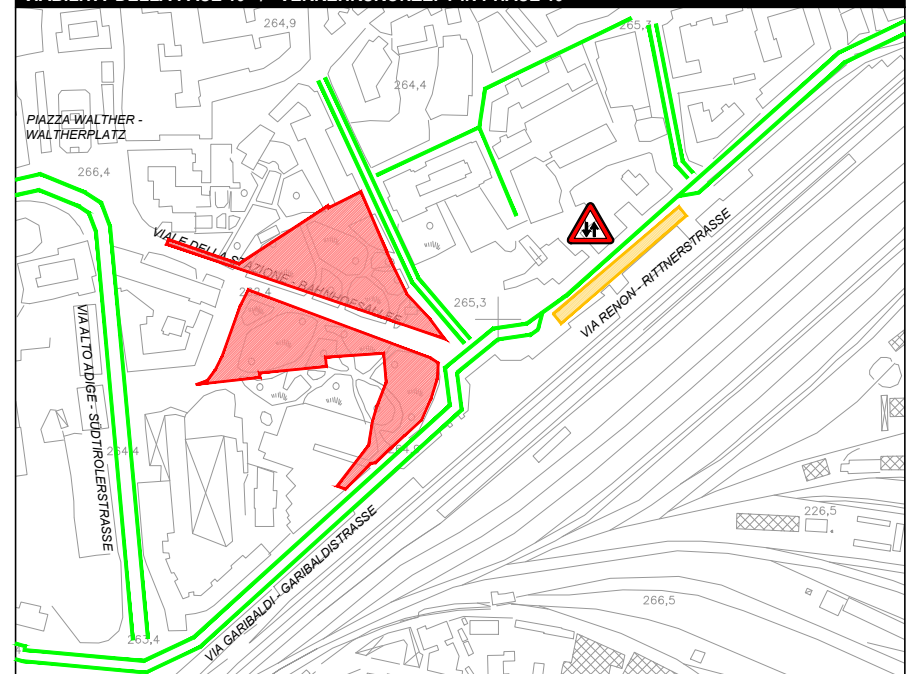

MESI/MONATE  
 28 29 30 31

17a	1	2	3
18a	1	2	3
18b	1	2	3
19	1	2	

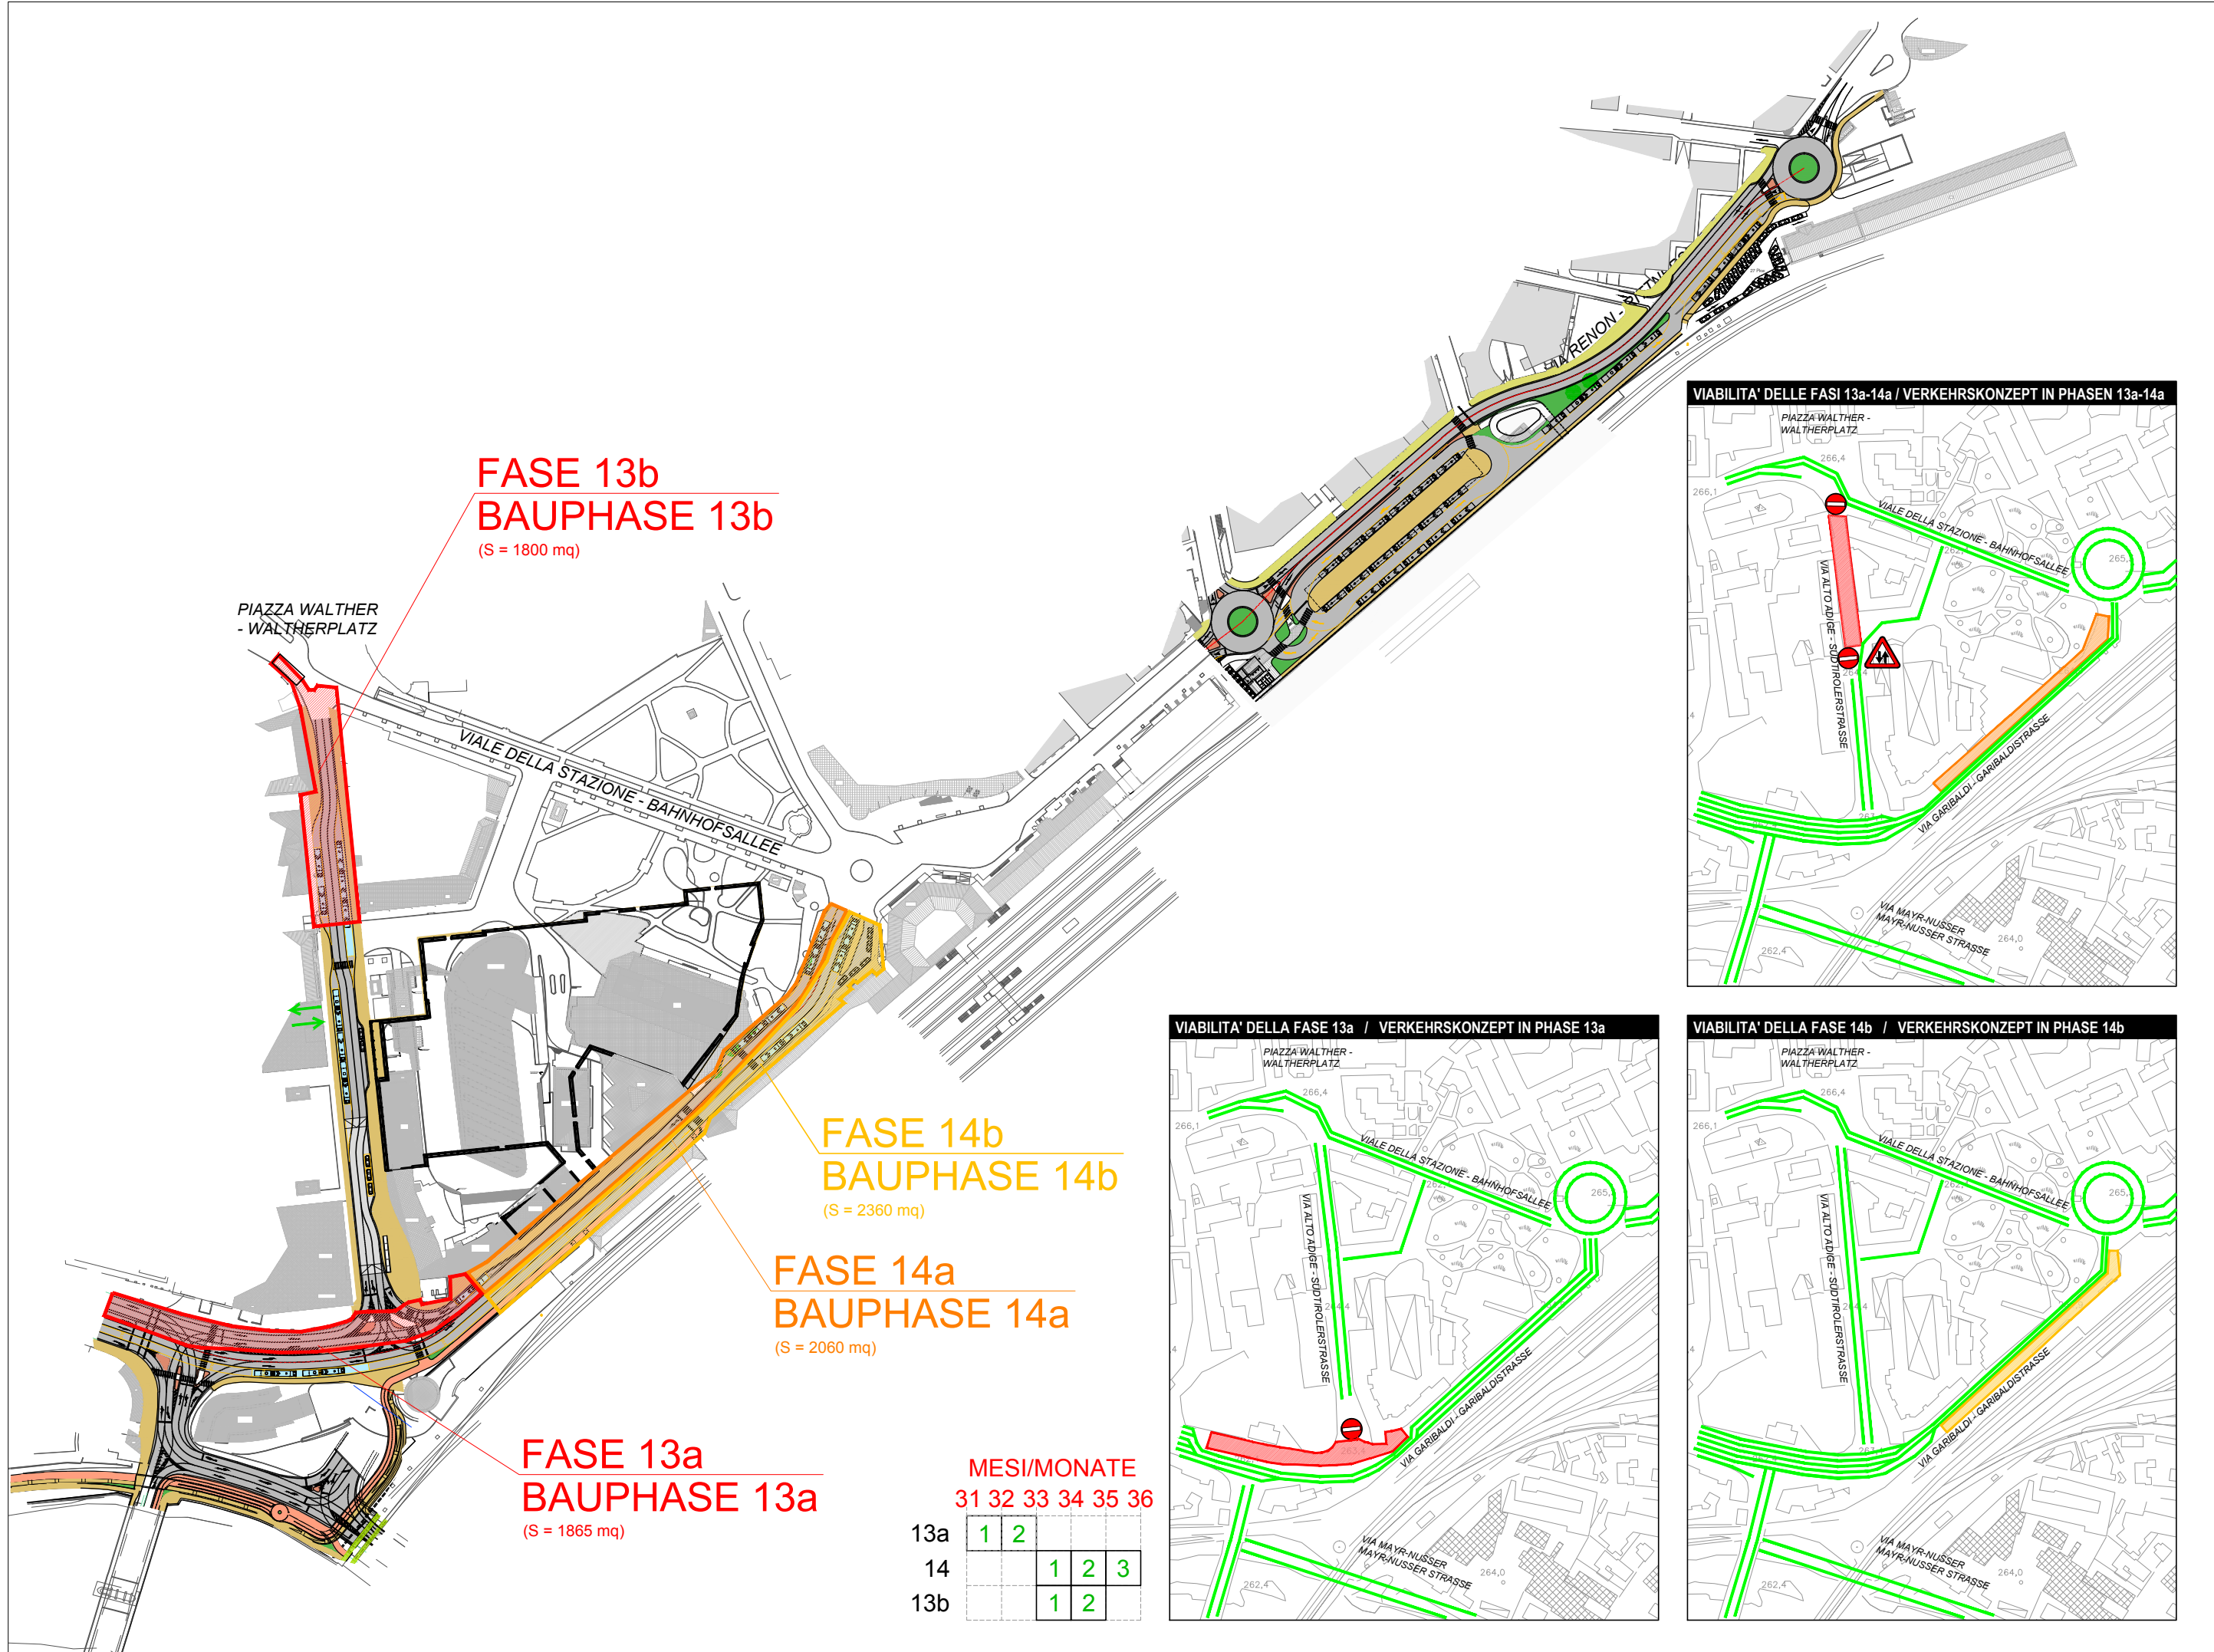

**FASE 13b**  
**BAUPHASE 13b**  
 (S = 1800 mq)

PIAZZA WALTHER  
 - WALTHERPLATZ

VIALE DELLA STAZIONE - BAHNHOF-SALLEE

**FASE 14b**  
**BAUPHASE 14b**  
 (S = 2360 mq)

**FASE 14a**  
**BAUPHASE 14a**  
 (S = 2060 mq)

**FASE 13a**  
**BAUPHASE 13a**  
 (S = 1865 mq)

	MESI/MONATE					
	31	32	33	34	35	36
13a	1	2				
14			1	2	3	
13b			1	2		

