FASE 1.1a - Primo semimpalcato / Bauphase 1.1a: Provvisorische erste Brücke

1 : 500

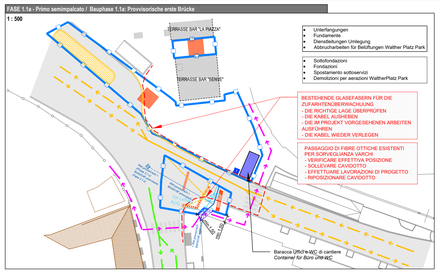

- Unterfangungen
- Fundamente
- Dienstleitungen Umlegung
- Abbrucharbeiten für Beistellungen Walther Platz Park

- Sottofondazioni
- Fondazioni
- Spostamento sottoservizi
- Demolizioni per aerazioni WaltherPlatz Park

BESTEHENDE GLASEFASERN FÜR DIE ZUFAHRTSÜBERWACHUNG
- DIE RICHTIGE LAGE ÜBERPRÜFEN
- DIE ROHRE VERLEGEN
- DIE IM PROJEKT VORGESEHENEN ARBEITEN AUSFÜHREN
- DIE KABEL WIEDER VERLEGEN

PASSAGGIO DI FIBRE OTTICHE ESISTENTI PER SORVEGLIANZA VARCHI
- VERIFICARE EFFETTIVA POSIZIONE
- ESEGUIRE PROTEZIONE
- EFFETTUARE LAVORAZIONI DI PROGETTO
- RIPOSIZIONARE CAVIDOTTO

FASE 1.2a - Secondo semimpalcato / Bauphase 1.2a: Provvisorische zweite Brücke

1 : 500

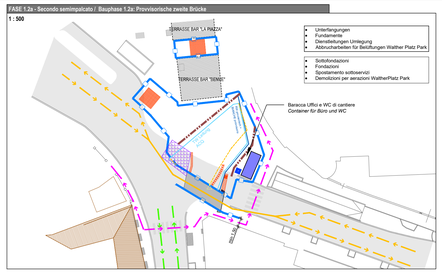

- Unterfangungen
- Fundamente
- Dienstleitungen Umlegung
- Abbrucharbeiten für Beistellungen Walther Platz Park

- Sottofondazioni
- Fondazioni
- Spostamento sottoservizi
- Demolizioni per aerazioni WaltherPlatz Park

Sezione 1.1a-1.2a / Detail 1.1a-1.2a

1 : 100

Der Auftragnehmer muss alle notwendigen Leistungen zur Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastrukturen wie z.B. Unterstützungen, seitliche Abstützungen, usw. erbringen welche notwendig sind um während der Grabungsarbeiten die einwandfreie Funktionalität der Bestandsinfrastrukturen zu gewährleisten.

L'appaltatore deve eseguire tutte le prestazioni necessarie per mantenere attiva il funzionamento delle infrastrutture esistenti come p.es. il sostegno di tubazioni attraverso scavi, sostegno laterale di tubazioni, etc. durante le attività di scavo.

- Unterfangungen
- Fundamente
- Dienstleitungen Umlegung

- Sottofondazioni
- Fondazioni
- Spostamento sottoservizi



FASE 1.3 - Realizzazione tunnel / Bauphase 1.3: Tunnel

1 : 500

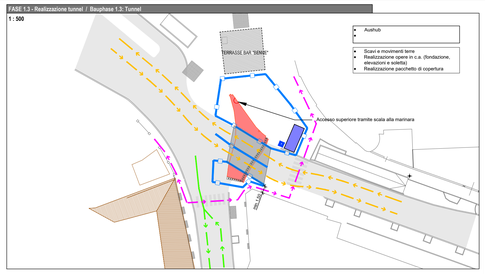

- Aushub

- Scavi e movimenti terre
- Realizzazione opere in c.a. (fondazione, elevazioni e solette)
- Realizzazione pacchetto di copertura

Pianta Piano Inferiore

1 : 500

FASE 1.1b - Primo semimpalcato / Bauphase 1.1b: Provvisorische erste Brücke

1 : 500

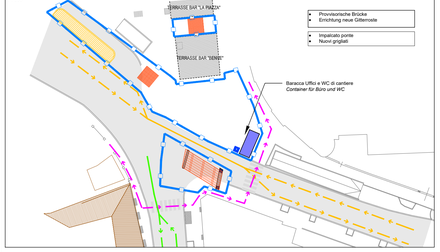

- Provvisorische Brücke
- Errichtung neue Gitterroste

- Impalcato ponte
- Nuovi grigliati

FASE 1.2b - Secondo semimpalcato / Bauphase 1.2b: Provvisorische zweite Brücke

1 : 500

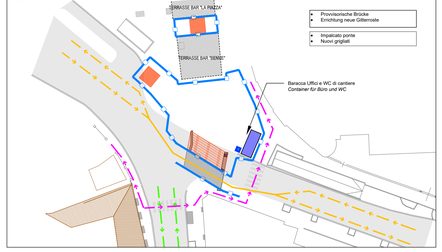

- Provvisorische Brücke
- Errichtung neue Gitterroste

- Impalcato ponte
- Nuovi grigliati

Sezione 1.1b-1.2b / Detail 1.1b-1.2b

1 : 100

Die entsprechende Unterstützung der bestehenden Telefon- und Stromleitungen in diesem Bereich mittels provisorischer Befestigung an einer zu realisierenden Stahlbrücke.

Sostenimento delle tubazioni esistenti delle linee telefoniche e elettriche tramite fissaggio provvisorio ad un ponte in acciaio da realizzare.

- Provvisorische Brücke

- Impalcato ponte



Pianta Piano Inferiore

1 : 500



- Demolizioni, taglio solaio ed installazione strutture di sostegno da realizzare in orario notturno, con la chiusura dell'accesso sottostante. Installazione ponteggio sotto solaio e chiusura ponteggio per passaggio veicoli in sicurezza durante realizzazioni superiori.

Abbrucharbeiten, Schneiden der Decke und Einbau der tragenden Struktur, Ausführung während der Nachtstunden mit Absperrung der unterliegenden Zufahrt. Nachfolgende Montage einer provisorischen Brücke (Gauß) für die sichere Durchfahrt von Fahrzeugen während der Ausführung der darüberliegenden Arbeiten.

- Abbrucharbeiten
- Schneiden der Decke
- Einbau der tragenden Struktur
- Wände Ausführung
- Errichtung neue Gitterroste

- Demolizione parchetto di copertura
- Taglio solaio
- Installazione strutture di sostegno
- Realizzazione muri in c.a.
- Installazione grigliati metallici

1 : 100



1 : 100



1 : 100

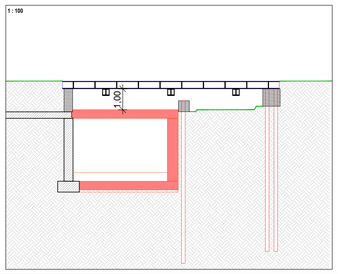

PARTICOLARE TAMPONAMENTO PROVVISORIO DI CANTIERE PER INTERNI / DETAIL PROVISORISCHER BAUSTELLE-INNENAUSFACHUNG AUS BESCHICHTETEN GIPSPLATTEN



PARTICOLARE RECINZIONE DI CANTIERE IN NEW JERSEY CON PANNELLI SCHERMANTI / NEW JERSEY FERTIGTEIL BAUZAUN MIT ABSCHIRMTAFELN DETAIL



PARTICOLARE PARAPETTO LIGNEO / HOLZ SEITENSCHUTZ DETAIL



		RIFERIMENTO ONERI SICUREZZA / SICHERHEITSREGELUNG BEZUGSNORMEN
	BARACCA GUARDIANO / *CONTAINER FÜR HÜTER*	art. 52.01.02.01 A / B
	BARACCA UFFICI / *CONTAINER FÜR BÜRO*	art. 52.01.02.01 A / B
	SPOGLIATOI / *UMKLEIDE*	art. S.20.10.0180.005 / 010 art. S.20.10.0190.005 / 010
	WC CHIMICO / *CHEMISCHES WC*	art. 52.01.02.04 A / B
	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE DOTATA DI LAMPEGGIATORI SINCRONIZZABILI / BEWEGBARER FERTIGTEILBAUZAUN, MIT SINCHRONISIERBAREN BLINKLAMPEN AUSGESTATTET	art. 52.02.02.04 B / C art. S.40.10.0090.005
	RECINZIONE DI CANTIERE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA E PANNELLI SCHERMANTI DOTATA DI LAMPEGGIATORI SINCRONIZZABILI / NEW JERSEY FERTIGTEILBAUZAUN MIT STAHLGITTER UND ABSCHIRMTAFELN, MIT SINCHRONISIERBAREN BLINKLAMPEN AUSGESTATTET	art. 52.02.02.07 B / C art. S10.10.0030.005 / 010 art. S.40.10.0090.005
	TAMPONAMENTO PROVVISORIO IN GESSO DOTATO DI LAMPEGGIATORI SINCRONIZZABILI / PROVISORISCHER BAUSTELLE-INNENAUSFACHUNG AUS BESCHICHTETEN GIPSPLATTEN, MIT SINCHRONISIERBAREN BLINKLAMPEN AUSGESTATTET	art. S.10.10.30 / 005 art. S.30.10.0005.005 / 010
	PARAPETTI IN LEGNO / HOLZ SEITENSCHUTZ	art. S.40.10.0090.005 art. S.30.10.0005.005 / 010
	LASTRE METALLICHE PER PASSAGGIO PROVVISORIO / METALLPLATTEN FÜR PROVISORISCHEN WEG	art. 52.02.02.36 A / B art. S.1.01.5.31 A / B
	AREA DI STOCCAGGIO / DEPOSITO MATERIALE / ZONE FÜR MATERIAL LAGER/DEPONIERUNG	
	AREA DI PONTEGGI / GERÜSTZONE	art. 51.02.09.03 A / B
	PERCORSO DEI MEZZI DI CANTIERE (accesso, uscita) / BAUSTELLENFAHRZEUGENSTRECKE (Einfahrt, Ausfahrt)	
	PERCORSO PEDONALE / FUßGÄNGERWEG	
	ACCESSO/USCITA CARRABILE / EINFAHRT/AUSFAHRT	
	VIABILITA' ORDINARIA / ÜBLICHER VERKEHR	
	VIABILITA' ORDINARIA (corsia Taxi e Bus) / ÜBLICHER VERKEHR (Taxi und Bus Fahrbahn)	

A

D

B

COMUNE _____
COMMITTENTE _____
PROGETTISTA _____
LICENZA EDIL N° _____
DENUNCIA C.A. N° _____
IMPRESA _____
DIRETTORE LAVORI _____
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE _____
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE _____
RESPONSABILE DEI LAVORI _____

E

OBBLIGO DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI
ZUGANG VERBOTEN
ZUTRITT VERBOTEN
OBBLIGO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
ZUTRITT VERBOTEN
ZUTRITT VERBOTEN
ZUTRITT VERBOTEN
